



ALNA

GRØNNSTRUKTUR

IDRETT OG KULTURMILJØ

GRORUDDALSSÅTSINGEN

PROGRAMOMRÅDE 2

2

ÅRSRAPPORT 2012
HANDLINGSPROGRAM 2013

Groruddalssatsingen



Oslo kommune



DEPARTEMENTENE

FORORD

Regjeringen og byrådet i Oslo inngikk 11. januar 2007 en intensjonsavtale om et samarbeid om Groruddalen for 10-årsperioden 2007-2016. Satsingen er tematisk bred og innordnet i fire programområder. Planlegging under hvert programområde er lagt til en programgruppe med bred deltakelse fra statlige og kommunale fagetater og fra bydelene i Groruddalen.

Programområde 2 - Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø - er et av de fire programområdene i satsingen.

Dette dokumentet består av tre deler:

1. Årsrapport for 2012
2. Handlingsprogram for 2010-2013
3. Fordeling av midler for 2013

Årsrapporten for Programområde 2 omfatter status og regnskap på prosjektene som har fått tilskudd fra de ekstraordinære groruddalsmidlene i 2012, samt en kort statusbeskrivelse på prosjektene som finansieres over ordinære kommunale budsjetter.

Handlingsprogrammet gjelder perioden 2010-2013 med tiltaksliste for 2013 som ble godkjent av Samarbeidsutvalget for Groruddalen 18. mars 2013. Handlingsprogrammet legger opp til en videreføring av strategiene om utvikling av sammenhengende grønnstrukturer og turveier på tvers og langs av dalen, bygging av en bydelspark i hver bydel og videreutvikling av Akergårdene og andre kulturmiljøer som møtesteder.

Handlingsprogrammet for Programområde 2 er utarbeidet av programgruppen som består av representanter for Oslo kommune og Staten. Oslo kommune representeres ved Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Kulturetaten, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten, Undervisningsbygg Oslo KF, Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna samt Plankontoret for Groruddalen, som har sekretariatsfunksjon i gruppen. Staten er representert ved Miljøverndepartementet, Husbanken Øst og Direktoratet for naturforvaltning. Programgruppen ledes av Bymiljøetaten.

Oslo, mars 2013

Groruddalssatsingen

INNHOOLD

DEL 1 ÅRSRAPPORT 2012

MÅLSTRUKTUR FOR GRORUDDALSSATSINGEN	4
1 OVERORDNET OM AKTIVITETENE I PROGRAMOMRÅDE 2 I 2012	8
1.1 Om Programområdet	8
1.2 Resultater	8
1.3 Måloppnåelse	9
1.4 Kobling til andre programområder	9
1.5 Fremdrift og utfordringer i 2012	10
2 STATUS OG ØKONOMI	11
2.1 Regnskap	11
2.2 Finansiering	11
2.3 Oversikt over tiltakene i programområde 2	12
2.4 Beskrivelse av tiltakene	17
2.5 Bydelsrusken Groruddalen	29
3 STATUS FOR ORDINÆRE TILTAK	31
3.1 Ordinære tiltak	32
4. FERDIGSTILTE TILTAK I PERIODEN 2007–2012	33

DEL 2 HANDLINGSPROGRAM 2010–2013

1 INNLEDNING	38
2 LANGSIKTIG HOVEDMÅL FOR GRORUDDALEN	38
2.1 Mål for Programområde 2 «Alna, Grønnstruktur, idrett og kulturmiljø»	38
2.2 Kobling mellom hovedmål og Programområde 2	38
3 MÅLGRUPPE	39
4 STRATEGI	39
4.1 Kriterier for valg av tiltak:	39

5 TEMATISK INNSATSOMRÅDE	40
5.1 Delmål 1: Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs Alna og mest mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden	41
5.2 Delmål 2: Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i til- knytning til grønnstruktur og boligområder	42
5.3 Delmål 3: Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder	44
5.4 Delmål 4: Tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	

DEL 3 FORDELING AV MIDLER 2013

1 TILTAK FINANSIERT MED EKSTRAORDINÆRE MIDLER	50
2 TILTAK FINANSIERT MED ORDINÆRE MIDLER	51
VEDLEGG 1: Mandat for programgruppe 1	54
VEDLEGG 2: Organisering av Groruddalssatsingen	56
VEDLEGG 3: Intensjonsavtale	57

Målstruktur for Groruddalssatsingen

Langsiktig hovedmål

Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprusting, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 1 – Miljøvennlig transport i Groruddalen

Hovedmål:

Målet er å styrke miljøvennlig person- og godstransport, oppnå bedre luftkvalitet og mindre støy, estetisk opprusting, universell utforming og trafikkssikkerhet. Programmet skal bidra til at Groruddalen inngår som en integrert del av et miljøvennlig transportsystem for Osloregionen.

Delmål:

1. Miljøet og trafikkssikkerheten langs veinettet skal bedres.
2. Kollektivtransporttilbudet i Groruddalen skal bli bedre, blant annet på tvers av dalen og tilgjengeligheten til stasjoner skal bedres.
3. Gang- og sykkelveinettet skal bli sammenhengende.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 2 – Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø

Hovedmål:

Målet er å styrke Groruddalens blågrønne struktur og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett og bedre luftkvalitet. Kulturminner skal vernes og brukes og dalens historieforståelse skal styrkes.

Delmål:

1. Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs Alna og mest mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.
2. Grønnstrukturen og turveier skal bli
3. sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder.
4. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder.
5. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.



MÅL PROGRAMOMRÅDE 3

Bolig-, by- og stedsutvikling i Groruddalen

Hovedmål:

Målet er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentre og næringsområder og attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. De mest levekårsutsatte områdene bør prioriteres særskilt.

Delmål:

1. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres med bred lokal deltakelse og innflytelse. Lokal kompetanse og ledelsesressurser skal anvendes og styrkes.
2. Områdeplanlegging skal tilrettelegge for en helhetlig, fremtidsrettet byutvikling i bolig- og næringsområder, der lokalsentre og stasjonsnære områder styrkes. Det skal være høy standard på uteområder og bygninger som oppgraderes.
3. Lokal tilhørighet blant befolkningen skal økes og omdømmet forbedres.
4. Det skal utvikles gode sosiale og inkluderende møteplasser i lokalmiljøet.
5. Bo-, oppvekst- og nærmiljøer skal være gode og oppleves som trygge.

MÅL PROGRAMOMRÅDE 4

Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering

Hovedmål:

Målet er å bedre levekår, skole og oppvekst, kultur og nærmiljø og å styrke inkludering gjennom medvirkning, deltakelse og frivillig innsats. Gjennom å utvikle samarbeidsstrukturer, kompetanse og nye metoder skal arbeidet bidra til å styrke bydeler og skole også etter at satsingen er over.

Delmål:

1. Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelige norsksferdigheter til å mestre skolestart og følge ordinær undervisning, og foreldres medvirkning skal styrkes.
2. Læringsresultater og gjennomstrømning på skolene i Groruddalen skal bedres til Oslo-gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller mellom skole, bydel og hjem skal videreutvikles.
3. Sysselsettingsgraden i Groruddalen skal økes. Den relative økningen skal være høyere enn økningen i Oslo som helhet.
4. Helsetilstanden blant befolkningen i Groruddalen skal bedres.
5. Ungdomstilbudene i Groruddalen skal utvikles som attraktive og inkluderende møteplasser. Ungdom skal kunne delta i positive aktiviteter og gis mulighet for voksenkontakt.
6. Opprettholde og utvikle et variert og inkluderende kultur- og foreningsliv med bred deltakelse fra alle befolkningsgrupper i Groruddalen. Frivilligheten skal gis gode rammer og utviklingsmuligheter.

ÅRSRAPPORT 2012



Å skape attraktive møteplasser i den blågrønne strukturen er den røde tråden i Programområde 2s arbeid. Med fokus på dalens unike naturmangfold og kulturminner håper vi å kunne legge til rette for at bydelenes beboere skal møtes og bli kjent med hverandre på tvers av alder, etnisitet og kulturforskjeller. Tiltakene skal bidra til økt fysisk aktivitet, rekreasjon og kulturaktiviteter gjennom opplevelse langs turveiene og ved de restaurerte Akergårdene, som i økende grad fremstår som attraktive møteplasser.

1. OVERORDNET OM AKTIVITETENE I PROGRAMOMRÅDE 2 I 2012

1.1 Om Programområdet

I dette programområdet arbeides det med tiltak som skal bidra til å nå fem delmål knyttet til henholdsvis åpning av Alna med sidebekker, opparbeidelse av grønnstruktur, tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet, bevaring av biologisk mangfold samt sikring og vern av kulturmiljø. Det jobbes med tre hovedstrategier: utvikling av sammenhengende grønnstrukturer og turveier på tvers og langs av dalen, bygging av en bydelspark i hver bydel og videreutvikling av Akergårdene og andre kulturmiljøer som møteplasser.

I satsingens første periode ble dalbunnen prioritert for å gjøre området mer tilgjengelig for rekreasjon og naturopplevelser. I perioden 2010-2013 legges det større vekt på tiltak i og rundt boligområdene med å skape attraktive møteplasser der folk bor.

Synlig miljøopprusting og bedre livskvalitet i Groruddalen er mål for satsingen og for Programområde 2. Det jobbes områderrettet og tverrsektorielt for å sikre at tiltak innenfor de ulike programområdene fungerer samordnet og skaper synergieffekter både lokalt og for dalen som helhet.

1.2 Resultater

Programområde 2 har i 2012 omfattet 42 tiltak. Seks av disse var nye i 2012, mens 36 er videreførte tiltak fra perioden 2007-2011. 15 tiltak ble ferdigstilt i løpet av året, og tre ble avviklet. Av de 24 videreførte tiltakene i 2013 planlegges 14 ferdigstilt eller etappevis ferdigstilt i løpet av året. Tidspunkt for åpning av Bjerkedalen park, Grorud park, første etappe av Verdensparken med parkouranlegg samt Rommensletta skulpturpark er satt til vår/høst 2013.

Det var flere store prosjekter som ble ferdigstilt i 2012, eksempelvis *Grorudveien 5*, det siste av to arbeiderboliger som er restaurert og tatt i bruk til kulturaktiviteter og frivillighet. I 2013 vil hageanlegget bli restaurert, og det vil arbeides med planlegging av en akse fra boligene gjennom Grorud idrettsanlegg

ned til Grorud park. *Digitalt kulturkart* ble lansert våren 2012. Kartet skal bidra til å gi informasjon om Groruddalens kulturhistorie og brukes blant annet til undervisning i skolene. *Mulighetsstudie av Arveset gård* og *Skjøtselplan for Bakås skanse* er ferdigstilt og overlevert til ansvarlige etater. Av andre tiltak som ble ferdigstilt i 2012, kan det nevnes opprusting av *Haugerud idrettsanlegg* med etablering av ny tennisbane, streetbasketbane, tribuner og ballbaner. Tiltakene har resultert i vekst i medlemstallet, og ikke-organisert aktivitet har økt. Ferdigstilling av *Teisenparken* har også bidratt til en økning av besøkende. Ferdigstilling av mulighetsstudier og prosjektering av flere turveisstrekkninger og mindre grøntarealer bygger opp under målsetningen om en sammenhengende grønnstruktur og turveinettet. Det vil jobbes videre med gjennomføring av disse i 2013.

Tre tiltak er utsatt eller avviklet. To turveisstrekkninger er utsatt, den ene grunnet uavklarte forhold med grunneier Statsbygg og den andre grunnet nedprioritering. Midlene er omdisponert til andre GDS-tiltak i etaten. Det vil søkes nye midler til de utsatte prosjektene på et senere tidspunkt. *Adkomst Bånkall gård* er avviklet og slått sammen med hovedprosjektet *Restaurering av Bånkall gård*. *Bydelsrusken Groruddalen*, tidligere omtalt som *Aksjon vakrere Groruddalen*, hadde 26 tiltak under gjennomføring i 2012, nærmere informasjon om hvert tiltak finnes på side 29

I 2012 har programgruppen hatt som mål å stimulere til økt fysisk aktivitet og mobilisere til bruk av ferdigstilte prosjekter. Det ble satt av friske midler som ble brukt til elvevandring langs Alna og danseforestilling ved isdammen på Årvoll. Tiltakene trakk mange mennesker, og målsetningen om å få publikum til å ta i bruk friarealene ble nådd.

Tre nye tiltak finansiert over kommunens ordinære budsjett innenfor satsingen ble satt i gang i 2012. Av

14 innrapporterte tiltak er to ferdigstilt, og tre tiltak planlegges ferdigstilt i 2013. Fornyelse av avløpsnettet for å redusere forurensing av Alna gjennomføres kontinuerlig hvert år. Gjennomføring av de øvrige tiltakene har lengre tidshorisont.

1.3 Måloppnåelse

Tiltakene i Programområde 2 er direkte knyttet opp mot hovedmålet for satsingen og legger særlig vekt på å etablere og forsterke grønnstrukturen på langs og tvers av dalen og tilrettelegge for aktiviteter og opplevelse i tilknytning til både grønnstrukturen og kulturmiljøet. Målet med å styrke dalens identitet og stolthet blir fulgt opp gjennom alle programgruppens delmål. I Programområde 2 ved forskjønning av friarealer og synliggjøring av dalens historie gjennom bevaring og bruk av kulturminner. Ved å etablere grønne lunger for rekreasjon og fysisk aktivitet følges satsingens intensjon opp om å bedre miljø og levekår i dalen. Spesifikke prosjekter for delmål 4 *Det biologiske mangfoldet skal sikres og utvikles* har ikke hatt egne tiltak finansiert av GDS-midler. Dette delmålet er foreslått fjernet som delmål. Saken behandles i Samarbeidsutvalget i mars 2013. Delmålet fyller en viktig funksjon som en påminnelse om at biologisk mangfold i Groruddalen skal ivaretas i alle fysiske prosjekter som initieres langs Alna, sidebekker og i grønnstrukturen for øvrig. Det gir også en påminnelse om at det biologiske mangfold skal utvikles når nye arealer tilrettelegges til parker, naturområder og møtesteder. Det foreslås derfor å integrere delmålet i delmål 2.



Fra åpningen av Grorudveien 3 og 5. Foto Roy Tjomsland.



PRIMÆRT DELMÅL

Delmål 1	4
Delmål 2	18
Delmål 3	13
Delmål 4	0
Delmål 5	7

1.4 Kobling til andre programområder

Programområdets strategi om å etablere en bydelspark i hver bydel har en direkte kobling til Programområde 1 gjennom deres arbeid med bygging av sykkelveier i områdene. I siste periode av satsingen vil programområdene samarbeide spesifikt for å få realisert Linjeparken i bydel Stovner. Programområde 1 bygger bussterminalen med delfinansiering fra Programområde 2, mens Programområde 2 finansierer parkanlegget i tilknytning til Stovner senter og terminalen. Flere av grøntområdene ligger i Programområde 3s utvalgte områdeløft. Gjennom bydelenes arbeid får Programområde 2 og 3 en direkte kobling gjennom samkjøring av planer og delfinansiering av tiltak. Tiltakene rettet mot delmål 3 om etablering av aktivitetsparker, turveier og idrettsarenaer har kobling til Programområde 4s helseprosjektarbeid. Tiltak rettet mot delmål 5 om sikring av kulturminner som attraktive møtesteder er koblet til Programområde 4s mål om å opprette og utvikle et variert og inkluderende kultur- og foreningsliv. Bydelsrusken Groruddalen bidrar til måloppnåelse i Programområde 4s mål om at flere personer i utsatte grupper skal delta i arbeidslivet.



Fra lysvandringen langs Alnaelva. Foto Linn Førland.

1.5 Fremdrift og utfordringer i 2012

I 2012 har det vært jobbet mye med tiltak for å redusere overføring av midler. Prosedyrene er strammet inn, og ingen prosjekter får bevilget midler til gjennomføring før det er utarbeidet konseptvalsutredning (KVU) med budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan. Gamle prosjekter har vært gjennomgått og kritiske spørsmål har vært reist. Resultatet er at flere tiltak er avviklet de to siste årene grunnet dårlig fremdrift. Midlene fra avviklede tiltak er blitt omdisponert til å fullfinansiere gryteferdige tiltak. For å få fortgang i gjennomføringen blir tiltakene nå finansiert i faser. Det vil si at bygging skjer når planlegging og prosjektering av en fase er fullført. Deretter blir hver etappe i gjennomføringen nøye vurdert før nye midler blir tildelt.

Til tross for dette har programområdet fortsatt visse utfordringer mht. til fremdrift og store overføringer. De fleste tiltakene er i rute i forhold til fremdriftsplanen, men noen prosjekter sliter fortsatt mht. gjennomføring. Enkelte turveistrekninger tar lang tid grunnet avklaring med grunneiere og interessekonflikter.

Fjellhus allé har stoppet opp. Årsaken er faglig uenighet og vanskeligheter med å komme i dialog med treansvarlig i Bymiljøetaten. Programgruppen vil prøve å finne en snarlig løsning på dette i løpet av våren 2013. Restaurering av Akergårdene har utfordring i forhold til fremdrift og budsjett. Dette skyldes at til tross for grundig forprosjektering har man avduket alvorlige råteskader i bygningene som fordyrer prosjektene. Dette gjelder spesielt Nordre Lindeberg gård og Bånkall gård. Førstnevnte ferdigstilles våren 2013 med et merforbruk på ca. 1. mill. kr. På grunn av dårlig sikring av låven på Bånkall gård måtte etaten bygge opp en nedrast murkonstruksjon. Dette har medført et merforbruk på 1,2 mill. kr. Det rapporteres om behov for mer midler. Etaten vurderer sluttfinansiering av tiltaket. Det er ikke bevilget midler til restaurering av låven gjennom Programområde 2, derimot er det bevilget midler til utarbeidelse av en KVU med budsjett, finansiering og fremdriftsplan som skal ferdigstilles våren 2013. Blir denne godkjent, kan det søkes midler til restaurering av låven i 2014.



Fra lysvandringen langs Alnaelva Foto Linn Karen Førland.

2 STATUS OG ØKONOMI

2.1 Regnskap

I Programområde 2 ble det i 2012 satt av midler til 42 prosjekter. Tiltakene det rapporteres på, hadde et samlet budsjett på 166,45 mill. kr. Av disse er 86,037 mill. overførte midler fra 2011, og 57,85 mill. kr. er nye ekstraordinære Groruddalsmidler i 2012. Tiltakene har også generert andre midler på til sammen 37,91 mill. kr. som i hovedsak består av statlige tilskudd, spillemidler og ordinære kommunale midler. Samlet regnskap for tiltakene pr. 31.12.2012 er på 98,43 mill. kr. Overførte Groruddalsmidler til 2013 er 63,21 mill. kr., og overført annen finansiering er 4,8 mill. kr. En stor andel av overført beløp er bundet opp i avtaler, men ikke fakturert ved årsskiftet. I 2012 ble det regnskapsført 98,43 mill. kr. av et totalbudsjett på 166,45 mill. kr. Det er en økning i regnskapsførte midler fra 2011 til 2012 på 19,67 mill. kr. For tiltakene som blir finansiert over ordinære kommunale midler, er rapporteringen forenklet til kun å omfatte tiltakenes status og samlet finansiering fra kommunale etater.

2.2 Finansiering

For Programområde 2 ble det i handlingsprogrammet for 2012 satt opp en prioritering av tiltak innenfor en ramme på 42,5 mill. kr., der de statlige og kommunale bidragene var på henholdsvis 30 mill. og 12,5 mill. kr. I tillegg ble 15,35 mill. kr tildelt gjennom Programområde 3A, hhv. 7,38 statlige og 7,88 kommunale. Disse midlene blir regnskapsført under annen finansiering. Total tildeling av GSD-midler for Programområde 2 var 57,85 mill. kr. Fordeling av ekstraordinære Groruddalsmidler i Programområde 2 ble økt fra 41 mill. til 42,5 mill. kr. fra 2011 til 2012. I tillegg ble delfinansiering gjennom områdeløft økt fra 1,094 mill. til 15,35 mill. kr. Det ble i tillegg satt av 14,83 mill. kr. over kommunens ordinære budsjetter innenfor Programområde 2.

«I Programområde 2 ble det i 2012 satt av midler til 42 prosjekter. Tiltakene det rapporteres på, hadde et samlet budsjett på 166,45 mill.»


Tabell 1

OVERFØRTE MIDLER FRA 2011	NYE GDS- MIDLER 2012	ANNEN finansiering	TOTALT BUDSJETT 2012	REGNSKAPSFØRT 2012	OVERFØRTE MIDLER TIL 2013
86 036 80 ¹	42 500 000	37 910 169 ²	166 446 970	98 430 386	68 016 584 ³

¹ Oppgitt overført sum i årsrapport fra 2011 var 89 586 111. Avviket fra oppgitt tall i årsrapport 2012 skyldes feil innrapportering med bl.a. dobbelføring av overførte midler og annen finansiering.

² Av dette er 15,35 mill. kr. delfinansiering fra PG3A områdeløft, hhv. 7,375 statlige og 7,875 kommunale GDS-midler.

³ Av dette er 63,3 mill. kr. GDS-midler og 4,8 mill. kr. annen finansiering.



2.3 OVERSIKT OVER TILTAKENE I PROGRAMOMRÅDE 2

Tabell 2

GDS-nr	NAVN PÅ TILTAK	NAVN PÅ TILTAK	ANSVAR BYDEL/ETAT	OVERFØRT FRA 2011	NYE STATLIGE GDS-MIDLER 2012	NYE KOMMUNLAE GDS-MIDLER 2012	ANNEN FINANSIERING 2012	TOTALBUDSJETT 2012	REGNSKAP 2012	MIDLER GDS OVERFØRT TIL 2013	MIDLER ANNEN FINANSIERING OVERFØRT 2013	BUNDNE MIDLER	STATUS
2.1.1.08	Bjerkedalen park, gjennomføring	BBJ	BBJ	15 404 498 ⁴	8 000 000	7 000 000	10 000 000 ⁵	40 404 498	20 410 689	19 993 809	0	14 785 430	V
2.1.1.10	Grorud park, 1. etappe gjennomføring	BGR	VAV	2 403 000 ⁶	0	0	0	2 403 000	2 403 000	0	0	0	F
2.1.1.11	Grorud park, 2. etappe gjennomføring	BGR	VAV	0	15 000 000	3 000 000	3 750 000 ⁷	21 750 000	16 309 260	5 440 740	0	5 440 740	V
2.1.2.11	Åpning av bekker på Furuset – mulighetsstudie	BAL	PBE	115 387	0	0	0	115 387	73 396	41 991 ⁸	0	0	F
2.2.3.09	Linjeparken gjennomføring	BSR	BYM	2 467 707 ⁹	0	0	0	2 467 707	283 494	2 184 213	0	0	V
2.2.6.09	Turvei D16/ Ytre Ringvei, krysningspunkt Mulighetsstudie	BAL	BYM	958 684 ¹⁰	0	0	0	958 684	1 226 967	-268 283 ¹¹	0	0	F
2.2.7.09	Turvei D16/ Ytre Ringvei/ Tvetenveien, del 1 gjennomføring	BAL	BYM	1 771 320 ¹²	0	0	0	1 771 320	218 012	1 553 308	0	120 000	V
2.2.2.10	Fjellhus Alle gjennomføring	BAL	BAL	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000	0	460 000	V
2.2.4.10	Turvei D15 langs Lindebergbekken prosjektering	BAL	BYM	800 000	0	0	487 000 ¹³	1 287 000	0	1 287 000	0	0	V
2.2.5.10	Grønn tverrforbindelse i Groruddalen mulighetsstudie	BAL BBJ	BYM	409 094	0	0	0	409 094	0	409 094 ¹⁴	0	0	F
2.2.6.10	Lindebergparken planlegging	BAL	BYM	487 000	0	0	0	487 000	487 000 ¹⁵	0	0	0	A

GDS-nr	NAVN PÅ TILTAK	NAVN PÅ TILTAK	ANSVAR BYDEL/ETAT	OVERFØRT FRA 2011	NYE STATLIGE GDS-MIDLER 2012	NYE KOMMUNLAE GDS-MIDLER 2012	ANNEN FINANSIERING 2012	TOTALBUDSJETT 2012	REGNSKAP 2012	MIDLER GDS OVERFØRT TIL 2013	MIDLER ANNEN FINANSIERING OVERFØRT 2013	BUNDNE MIDLER	STATUS
2.2.8.10	Smalvollveien v/Tveten-brua Fyrstikkbakken Mulighetsstudie	BAL	BYM	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	F
2.2.12.10	Statsråd Mathiesensvei, Lunden, turvei D6 – prosjektering	BBJ	BYM	343 455	0	0	0	343 455	343	343 112	0	0	V
2.2.13.10	Byggeren leke-/ oppholdsareal m/ bekkeåpning gjennomføring	BSR	BYM	13 124 618	0	1 500 000	0	14 624 618	914 791	11 309 827	2 400 000	0	V
2.2.14.10	Bydels rusken Grorud dalen16 gjennomføring	Hele GD	BYM	6 467 250	2 400 000	0	4 400 000 ¹⁷	13 267 250	7 708 050	5 559 200	0	1 950 000	V
2.2.16.10	Verdensparken Gjennomføring	BAL	BYM	14 657 989	0	0	6 800 000 ¹⁸	21 457 989	17 922 801	3 535 188	0	3 535 188	V
2.2.2.11	Turvei D8 Vesletjern/Kristian Bogeruds vei – bygging	BGR	BYM	2 350 000	0	0	0	2 350 000	2 350 000 ¹⁹	0	0	0	F
2.2.3.11	Turvei D10 gjennom Brynområdet gjennomføring	BAL	BYM	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	V
2.2.5.11	Turvei 15 gjennom Bredtvetområdet gjennomføring	BBJ	BYM	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000 ²⁰	0	0	0	A
2.2.6.11	Turvei 15 grønn terrasse prosjektering		BYM	150 000	0	0	0	150 000	85 000	65 000	0	65 000	V
2.2.7.11	Turvei D16 Smalvoll-veien – Ytre Ringvei, bygging (del 2)	BAL	BYM	4 044 934 ²¹	0	0	0	4 044 934	3 496 377	548 557	0	548 557	V

GDS-nr	NAVN PÅ TILTAK	NAVN PÅ TILTAK	ANSVAR BYDEL/ETAT	OVERFØRT FRA 2011	NYE STATLIGE GDS-MIDLER 2012	NYE KOMMUNLAE GDS-MIDLER 2012	ANNEN FINANSIERING 2012	TOTALBUDSJETT 2012	REGNSKAP 2012	MIDLER GDS OVERFØRT TIL 2013	MIDLER ANNEN FINANSIERING OVERFØRT 2013	BUNDNE MIDLER	STATUS
2.2.8.11	Teisenparken Gjennomføring	BAL	BAL	1259 000 ²²	0	1000 000	0	2259 000	2 413 605	-154 605 ²³	0	0	F
2.2.1.12	Rommensletta skulpturpark, gjennomføring	BSR	BYM	0	3 000 000	0	4 500 000 ²⁴	7 500 000	63 539	7 436 461	0	7 436 461	V
2.3.9.07	Bakås skanser forvaltningsplan	BAL	BYA	126 595	0	0	0	126 595	110 000	16 595 ²⁵	0	0	F
2.3.1.09	Nordre Lindeberg gård restaurering	BAL	KUL	4 602 449 ²⁶	0	0	1 500 000 ²⁷	6 102 449	5 592 702	509 747	0	509 747	V
2.3.2.09	Bånkall Gård Restaurering	BGR	KUL	3 362 998 ²⁸	0	0	1 950 000 ²⁹	5 312 988	3 550 713	1 762 275	0	7 150 000 ³⁰	V
2.3.2.10	Årvoll isdam gjennomføring	BBJ	BBJ	174 000	800 000	0	121 318 ³¹	1 095 318	1 056 930	38 388	0	0	V
2.3.3.10	London park steinbrudet kulturhus mulighetsstudie	BGR	BGR	250 000	0	0	38 327 ³²	288 327	191 634	96 693	0	0	V
2.3.4.10	Arveset gård mulighetsstudie	BAL	BYA	19 559	0	0	0	19 559	0	19 559 ³³	0	0	F
2.3.7.10	Grorud samfunnshus mulighetsstudie	BGR	BGR	26 581	0	0	0	26 581	0	26 581 ³⁴	0	0	F
2.3.2.11	Bånkall gård ny adkomst forprosjekt	BGR	KUL	200 000	0	0	0	200 000	200 000 ³⁵	0	0	0	A
2.3.4.11	Digitalt kulturkart Gjennomføring	Hele GD	BYA	262 100 ³⁶	0	0	0	262 100	218 957	43 143 ³⁷	0	0	F
2.3.5.11	Bakås skanser gjennomføring av skjøtselsplan	BAL	BYM	371 000	0	0	110 000 ³⁸	481 000	200 000	281 000	0	0	V

GDS-nr	NAVN PÅ TILTAK	NAVN PÅ TILTAK	ANSVAR BYDEL/ETAT	OVERFØRT FRA 2011	NYE STATLIGE GDS-MIDLER 2012	NYE KOMMUNLAE GDS-MIDLER 2012	ANNEN FINANSIERING 2012	TOTALBUDSJETT 2012	REGNSKAP 2012	MIDLER GDS OVERFØRT TIL 2013	MIDLER ANNEN FINANSIERING OVERFØRT 2013	BUNDNE MIDLER	STATUS
2.3.6.11	Grorud-veien 5 gjennomføring	BGR	KUL	3911 300	0	0	0	3911 300	5 528 565	-1 617 265 ³⁹	0	0	F
2.3.1.12	Skilting av kulturminner i Groduddalen	Hele dalen	BYA	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000	0	50 000	V
2.4.1.08	Kunstisflate Løren Gjennomføring ⁴⁰	BBJ	BYM	1970 794 ⁴¹	0	0	0	1970 794	1 748 494 ⁴²	222 300	0	0	A
2.4.1.11	Kunstisflate Stovner prosjektering	BSR	BYM	162 906	0	0	0	162 906	226 295	-63 389 ⁴³	0	0	F
2.4.5.11	Haugerud idrettsanlegg gjennomføring	BAL	BAL	522 593	0	0	132 730 ⁴⁴	655 323	641 172	14 151 ⁴⁵	0	0	F
2.4.1.12	Stig skolegård Gjennomføring	BSR	UBF	0	200 000	0	1 250 000 ⁴⁶	1 450 000	131 400	68 600	1 250 000	1 318 600	V
2.4.2.12	Vestli skolegård Gjennomføring	BSR	UBF	0	200 000	0	1 150 000 ⁴⁷	1 350 000	167 200	32 800	1 150 000	1 182 800	V
2.4.3.12	Fysiske aktiviteter mobiliserende tiltak		BYM	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	F
2.4.4.12	Grorud idrettspark/akse prosjektering	BGR	BYM		0	0	1 720 794 ⁴⁸	1 720 794	0	1 720 794	0	0	V
SUM				86 036 801	30 000	12 500 000	37 910 169	166 446 970	98 430 386	63 216 584	4 800 000	44 695 155	



FOTNOTER

- 4 3,2 mill. kr. av overførte midler er ordinære kommunale midler fra BYM.
- 5 Annen finansiering er 6,5 mill. kr. fra områdeløft hhv. 2,875 kommunale og 3,625 statlige og 3,5 mill. kr. ordinære kommunale midler fra Vann- og avløpsetaten.
- 6 Summen kr. 2 603 179 som ble rapportert inn til årsrapport for 2011, var feil. Årsaken til feilen var at annen finansiering (kommunale ordinære midler) ble rapportert på to steder, både i kolonnen «annen finansiering» og «tildelte midler».
- 7 0,5 mill. kr. er ordinære kommunale midler (VAV) 1. mill. kr. er fra Statens vegvesen for å dekke utgifter til rensing av forurenset grunn. 2,250 er GDS-midler som er vedtatt overført prosjektet fra avviklede tiltak i BYM. Midlene var ikke budsjettjustert ved årets slutt.
- 8 Mindreforbruket omdisponeres til videre arbeid med åpning av bekken i tilknytting til Verdensparken.
- 9 Kr. 467 707 er GDS-midler og 2 mill. kr. er annen finansiering kommunal finansiering– Torg & møteplassmidler.
- 10 Kr. 939 927 er overført fra prosjekt GDS.nr 2.2.9.10 *Brynsengfare*, kr. 18 757 er overførte GDS-midler.
- 11 Merforbruket dekkes gjennom ordinære midler.
- 12 Kr. 1 071 325 er GDS-midler og 0,7 mill. kr. er annen statlig finansiering (spillemidler).
- 13 Annen finansiering er overførte midler fra GDS.nr 2.2.6.10. *Lindebergparken*. Dette tiltaket er slått sammen med 2.2.4.10 *Turvei D 15 langs Lindebergbekken*.
- 14 Mindreforbruket overføres til underfinansierte tiltak i etaten.
- 15 Tiltaket er slått sammen med GDS.nr 2.2.4.10 *Turvei D15 langs Lindebergbekken*, midlene overføres hit.
- 16 Tidligere omtalt som Aksjon vakrere Groruddal.
- 17 2 mill. kr. er kommunale midler tildelt gjennom Plankontorets budsjett og 2,4 mill. kr. gjennom Bymiljøetaten ordinære budsjett.
- 18 Delfinansiering gjennom områdeløft, hhv. 2 mill. kr. kommunale og 2,35 mill. kr. statlige. 1 mill. kr. fra administrative GDS-midler, 0,5 mill. overført fra GDS.nr 2.2.5.11 *Turvei 15D gjennom Bredtvetområdet*, 0,25 mill. kr. er støtte fra DirNat og 0,7 mill. kr. er spillemidler.
- 19 2,35 mill. kr. er overført til GDS.nr 2.1.1.11 *Grorudparken*. Ved årsslutt var ikke midlene budsjettjustert. 0,1 mill. ble brukt til oppsetting av gjerde mellom privat og offentlig areal.
- 20 Prosjektet er avviklet. Midlene er overført med hhv. 1,5 mill. kr. til GDS. nr. 2.3.1.09 *Nordre Lindeberg gård* (KUL), og 0,5 til GDS.nr 2.2.16.10 *Verdensparken* (BYM). Midlene til KUL var ikke budsjettjustert ved utgangen av året, men rapporteres på som annen finansiering.
- 21 Kr. 394 934 er GDS-midler og 3,65 mill. kr. er annen finansiering, hhv statlige spillemidler og ordinære kommunale midler.
- 22 0,959 mill. kr. er restmidler overført fra GDS.nr 2.2.1.10 *Youngslunden*.
- 23 Merforbruket dekkes inn av bydelens ordinære budsjett.
- 24 Delfinansiering områdeløft, hhv. 3 mill. kr. kommunale og 1,5 mill. kr. statlige.
- 25 Mindreforbruket brukes til skilting av Bakås skanse.
- 26 Kr. 3 102 449 er GDS-midler og 1,5 mill. kr. er kommunale ordinære midler.
- 27 1,5 mill. kr. er overført fra GDS.nr 2.2.5.11 *Turvei 15 gjennom Bredtvetområdet*. Midlene var ikke budsjettjustert ved utgangen av året.
- 28 Innrapportert beløp på kr. 3 521 736 i årsrapport 2011 var feil, det riktige beløpet er kr. 3 362 998.
- 29 1,430 mill. kr. er ordinære kommunale midler fra KUL, 0,32 mill. kr er ordinære kommunale midler fra Bydel Grorud og 0,2 mill. kr. er omdisponerte midler fra 2.3.2.11 *Ny adkomst Bånkall gård*.
- 30 Råteskade er årsaken til merforbruk, det er behov for ytterligere midler til å dekke overforbruket.
- 31 Annen finansiering er mva kr. 98 624 og leieinntekt kr. 22 694.
- 32 Annen finansiering er mva-refusjon.
- 33 Restmidler vil bli søkt omdisponert til GDS.nr 2.3.1.12 *skilting av kulturminner*.
- 34 Restmidler vil bli søkt omdisponert til andre underfinansierte tiltak.
- 35 Tiltaket er slått sammen med GDS.nr 2.3.2.10 *Restaurering av Bånkall gård* og midlene er overført dette prosjektet.
- 36 I årsrapporten 2012 ble det oppgitt overført kr. 261 888, dette er feil. Det riktige tallet er 262 100.
- 37 Mindreforbruket er omdisponert til å delfinansiere DIVE analyse i områdeløft.
- 38 Annen finansiering er overførte GDS-midler fra BYA.
- 39 Overforbruket er dekket inn over ordinære midler i etaten.
- 40 Tiltaket GDS.nr 2.4.1.08 *Kunstisflate på Løren* ble avviklet i 2011.
- 41 Summen i årsrapporten 2011 er feil. Årsaken til dette var at det ble innrapportert både det gjenstående beløpet og beløpet som ble overført til Furuset kunstisflate.
- 42 Kr. 1 720 794 er overført til prosjekt 2.4.4.12 *Grorud idrettspark og akse*.
- 43 Merforbruket dekkes av ordinære midler i BYM.
- 44 Annen finansiering er GDS-midler fra PG4 «frivillighetsmidler».
- 45 Mindreforbruket søkes omdisponert til underfinansiert GDS-tiltak i bydelen.
- 46 Ordinære kommunale midler.
- 47 Ordinære kommunale midler.
- 48 Midlene er overført fra GDS.nr. 2.4.1.08 *kunstisbane Løren*.



Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen viser stolt frem den nye Prestegårdshagen i Grorudparken. **Foto:** Roy Tjomsland.

2.4 Beskrivelse av tiltakene

Delmål 1: Åpning av Alnaelva

GDS-NR. 2.1.1.08 (tidligere 3.8.4.07) BJERKEDALEN PARK - GJENNOMFØRING

Målet er å opparbeide parken med aktivitetsområder og møteplass tilrettelagt for fysiske aktiviteter og rekreasjon. Hovinbekken skal gjenåpnes og badedammen skal reetableres. Det skal bygges paviljong med muligheter til kafédrift. Prosjektet er inndelt i tre etapper hvorav første etappe som består av terrengarbeid, åpning av Hovinbekken med badedam, bruer og vegetasjon langs vannet, er under ferdigstilling. Etappe 2 omfatter parkstier, belysning og beplantning, samt bygging av paviljong. Etappe 3 omfatter møblering, utstyr til aktivitetsplassene og 3-årig etableringsskjøtsel. Parken planlegges ferdigstilt sommeren 2013 og åpnes i slutten av august. Paviljongens utbygg vil stå ferdig til åpningen høsten 2013.

GDS-NR. 2.1.1.10/2.1.1.11 GRORUDPARKEN - GJENNOMFØRING

Målet er å opparbeide parken til et attraktivt rekreasjonsområde med grønne lunger, flotte turveier, god vannkvalitet og rehabilitering av den gamle Prestegårdshagen.

Første etappe er ferdigstilt. Det er etablert ny turvei med belysning, nye gangbroer over elva, oppholdsplass ved Kaldbakk bro, og den historiske hagen på Nedre Grorud gård (prestegårdshagen) er rehabilitert. Utslipp av forurenset overvann i Groruddammen er sanert. Arbeidet med opprydning og istandsetting av Groruddammen, og etablering av amfi rundt dammen pågår og planlegges ferdigstilt sommeren 2013. Det jobbes også med tilrettelegging av ny adkomst gjennom idrettsparken ved en aktivitetsakse. Se GDS.nr. 2.3.4.12 *Grorud idrettspark og aktivitetsakse*. Parken planlegges ferdigstilt sommeren 2013 med åpning i september.

GDS-NR. 2.1.12.11 ÅPNING AV BEKKER PÅ FURUSET - MULIGHETSSTUDIE

Tiltaket er ferdigstilt. Som del av områdeløftarbeidet på Furuset er det vurdert mulighet for bekkeåpning knyttet til utvikling av Verdensparken og som grunnlag for områdereguleringsplan på Furuset. Endelig rapport med endringer/tillegg er levert. Det er utarbeidet en overvannsplan som følger opp funnene i rapporten. Totalbudsjettet er 0,6 mill. kr., statlige GDS-midler. Det er regnskapsført 0,588 mill. kr. Restmidlene vil bli søkt omdisponert til videre arbeid mht. åpning av bekken.

Delmål 2: Utvikling av grønnstrukturen, sammenhengende turveinett og skape attraktive møteplasser

GDS-NR. 2.2.3.09 LINJEPARKEN - GJENNOMFØRING

Formålet med tiltaket er å anlegge et parkdrag foran Stovner senter med gang-/sykkelvei, samt etablere en sammenhengende gang-/sykkelvei videre langs Fossumveien. Tiltaket bidrar til å oppfylle målsetningen om etablering av sammenhengende tur-/sykkelveinett, attraktive møteplasser og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Første fase med mulighetsstudier for trafikk-løsning og skisseprosjekt for parken er ferdigstilt, og reguleringsplanen ligger til behandling i Rådhuset. Prosjektet vil bli utført i samarbeid med Programområde 1. Arbeidet med utarbeidelse av byggeplaner og trafikk-løsninger, samt prosjektering, starter våren 2013.

GDS-NR. 2.2.6.09 TURVEI D16/YTRE RINGVEI, MULIGHETSSTUDIE FOR KRYSSNINGSPUNKT

Tiltaket er ferdigstilt. Det er utarbeidet en mulighetsstudie for å finne best mulig løsning for å oppheve barrierevirkningen som Ytre Ringvei utgjør. Hensikten er å få en sammenhengende turvei mellom Groruddalens sentrale deler og Østmarka (turvei D16). Delstrekninger av turvei D16 på begge sider av Ytre Ringvei er under bygging i 2012 og ferdigstilles våren

2013. Prosjektet inneholder mulighetsstudie og prosjektering av gangbru over Ytre Ringvei og turvei med kryssing av bekkedalen (Hellerudbekken) fram til tilstøtende turvei v./Sigrid Undsets vei. Utredningen er utført sammen med prosjekt 2.2.8.10 Turvei D10 Smalvollen v./Tvetenbrua. Detaljprosjekt ble ferdigstilt i juni 2012. Prosjektet viser løsningsforslag for kryssing av Ytre Ringvei med kostnadsoverslag, som skal brukes for å søke finansiering av prosjektet.

Totalbudsjettet for prosjektet er 1,289 mill. kr., GDS-midler. Det er regnskapsført 1,558 mill. kr., og merforbruket er dekket ved omdisponering av midler fra i Bymiljøetaten.

GDS-NR. 2.2.7.09 TURVEI D16/YTRE RINGVEI, TVETENVEIEN - GJENNOMFØRING

Tiltaket gjelder bygging av en delstrekning på turvei D16. Tiltaket er i avslutningsfasen og forventes ferdigstilt våren 2013.

GDS-NR. 2.2.2.10 FJELLHUS ALLÉ - GJENNOMFØRING

Alleen har lokalhistorisk verdi og er en del av stedets identitet. Tiltaket er et av flere prioriterte tiltak i bydelens tiltaksplan for Teisen, Fjellhus og Ulven. Prosjektet gjelder en gammel bjørkeallé hvor eksisterende trær beskjæres, døde og skadde trær fjernes og erstattes med nye. Utredning pågår, men fremdriften er dårlig. Dette skyldes at det er vanskelig å komme i dialog med trepleieansvarlig i BYM, uenighet i valg av treslag, kostnader og samarbeid med grunneier. Det vil bli tatt stilling til evt. videreføring av prosjektet når utredning foreligger (mars 2012).

GDS-NR. 2.2.4.10 TURVEI D15 LANGS LINDEBERGBEKKEN/2.2.6.10 LINDEBERGPARKEN - GJENNOMFØRING

Turveistrekningen inngår i overordnet turveinett på tvers av dalen og er en oppfølging av *Mulighetsstudie Grønn tverrforbindelse i Groruddalen*. Tiltaket består av detaljprosjektering

av turveien, basert på forprosjekt. Prosjektering ses i sammenheng med detaljprosjektering av *Lindebergparken*. Anskaffelse av konsulentbistand er blitt utsatt til våren 2013 grunnet medvirkningsprosesser i samarbeid med områdeløft Lindeberg. Omreguleringsprosessen knyttes til øvre parsell er godt i gang.

GDS-NR. 2.2.5.10 GRØNN TVERRFORBINDELSE I GRORUDDALEN - MULIGHETSSTUDIE

Tiltaket er ferdigstilt. Mulighetsstudie innbefattet grunnlag for å styrke forbindelsen på tvers av dalen fra Lindeberg til Rødtvet. Bymiljøetaten har skissert mulig trasé for turvei gjennom Bredtvetområdet, mellom Trondheimsveien og eksisterende turvei D6. Det avventes tilbakemelding fra Statsbygg, som ønsker å foreta en mulighetsstudie av sitt arbeid i området. Dette arbeidet forventes ferdig vinteren 2012/13. Prosjektet er avhengig av positiv tilbakemelding fra grunneier (Statsbygg). Bymiljøetaten foreslår å utsette tiltaket. Totalbudsjettet er 0,5 mill. kr., statlige GDS-midler. Det er regnskapsført 0,09 mill. kr. Restbeløpet vil søkes omdisponert til underfinansierte GDS-tiltak i etaten.

GDS-NR. 2.2.8.10 SMALVOLLVEIEN VED TVETENBRUA

Tiltaket er ferdigstilt. Intensjonen har vært å utrede muligheter for å etablere turvei D 10 fra Bryn stasjon og videre nordover på vestsiden av Alna, fram til Fyrstikkbakken og Gamle Tveten bru over jernbanen. I tillegg ble det utredet muligheter for å forbedre turveien langs Alna/Smalvollveien frem til eksisterende turvei D 10 langs Smalvollen. Forprosjektet ble ferdigstilt i januar 2012; forslag til bordgang og sikringstiltak langs Smalvollveien, krysning over jernbanens hovedspor, turvei langs Alna og sykkelveitilknytning i Hans Nilsens vei. Utredningen er utført sammen med prosjekt 2.2.6.09 «Turvei D 16/Ytre Ringvei, Mulighetsstudie - krysningspunkt». Totalbudsjett 0,2 mill kr, statlige GDS-midler. Det er regnskapsført 0,2 mill kr.

GDS-NR. 2.2.12.10 TURVEI D6, STATSRAÅD

MATHISENS VEI/LUNDEN - PROSJEKTERING

Hensikten med prosjektet er å prosjektere turvei mellom eksisterende turvei D3 ved Statsråd Mathiesens vei og Bjerkedalen park. Strekningen inngår i det overordnede turveinettet i Groruddalen. Målsetningen er å supplere overordnet og sammenhengende turveinett i Groruddalen og tilrettelegge for fysisk aktivitet. Prosjektet og kostnadsberegnet turvei skal ligge til grunn for fremtidig søknad på midler og bygging. Avklaring av arealer og bruksrett er igangsatt. Prosjektering starter våren 2013.

GDS-NR. 2.2.13.10 BYGGEREN LEKE-/OPPHOLDSARENA MED BEKKEÅPNING - GJENNOMFØRING

Tiltaket innbefatter prosjektering og bygging av lokal park/lekeplass med bekkeåpning i forbindelse med Statens vegvesen Region østs (SVRØ) bygging av gang-/sykkelvei mellom Lørenskog stasjon og Haugenstua stasjon. Målsetningen er å åpne Julsbergbekken, etablere en attraktiv møteplass, etablere et sammenhengende turveinett og tilrettelegge for fysisk aktivitet. Planlegging, samkjøring og prosjektering har pågått i 2011 og 2012. Det er utført avklaringer med Vann- og avløpsetaten i forhold til bekkeåpning. Tentativ byggestart planlegges våren/sommeren 2013. Årsaken til forsinkelse er nødvendigheten av å samkjøre prosjektet med SVRØs bygging av gang- og sykkelvei «rute Østre Aker vei».

GDS-NR. 2.2.14.10 BYDELSRUSKEN GRORUDDALEN

Miljøverndepartementet satte i 2009 av en tiltakspakke på 10 mill. kr. til et spleiselag med kommunen og næringslivet for å rydde næringsområdene i dalbunnen og bedre tilgjengeligheten til miljøvennlig transport. Midlene ble øremerket til å få bedre orden på utemiljøet i dalbunnen og å skaffe bedre atkomster fra bedriftene til stasjoner og holdeplasser for kollektivtransporten, til grønnsstrukturen og sykkelveiene. Pr. 31.12.11 ble Aksjon vakrere Groruddal bestemt

«1. etappe med parkourpark, møteplasser med steindekke, belysning og damanlegg ble ferdigstilt i 2012.»



Fra parkouranlegget i Verdensparken på Furuset. Foto Jens Flemming Andersen.



overført til Bymiljøetaten med navnet *BydelsRusken Groruddalen*. Tiltaket finansieres med ordinære kommunale og GDS-midler. Det omfatter «Arbeidsryddegrupper» i hver bydel som viderefører aksjonsarbeidet og har som mål å holde egen bydel og Groruddalen ren og ryddig samt bidra til god tilgang for befolkningen til å bruke stier og fremkomstårer både på sommer og vinter. Gjennomførte tiltak med status ses i egen liste på s. 29.

GDS-NR. 2.2.16.10 VERDENSPARKEN - GJENNOMFØRING

Målet er å opparbeide parken til et attraktivt rekreasjonsområde med bekk, nytt parkdrag og aktivitetsarenaer. Prosjektet er delt i tre avsluttende etapper. Tiltaket bidrar til å oppfylle målsetningen om åpning

av sidebekker, etablering av en attraktiv møteplass og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. 1. etappe med parkourpark, møteplasser med steindekke, belysning og damanlegg ble ferdigstilt i 2012. Noe restarbeid som beplantning og påkobling av vann vil bli utført våren 2013. Prosjektering av Verdensparken 2. etappe starter våren 2013.

GDS-NR. 2.2.2.11 TURVEI D8 VESLETJERN/KRISTIAN BOGNERUDS VEI - GJENNOMFØRING

Tiltaket er midlertidig avvirket. Planen var å bygge turvei mellom Kristian Bogneruds vei og Vesletjern. I løpet av 2012 ble det vedtatt at bygging av turveien blir satt på vent og at midlene søkes omdisponert til GDS.nr. 2.1.1.11 *Grorud park*. Totalbudsjettet er 2,35 mill. kr., hhv. 0,825 statlige og 1,525 kommunale GDS-midler. Bymiljøetaten beholdt 0,1 mill. kr. til oppsetting av nytt gjerde mellom friområde og privat område. De resterende 2,250 mill. kr. er overført Vann- og avløpsetaten.

GDS-NR. 2.2.3.11 TURVEI D10 GJENNOM BRYNOMRÅDET - PROSJEKTERING

Intensjonen med tiltaket er å bidra til å etablere turvei D10 fra Bryn stasjon og videre nordover på vestsiden av Alna fram til Fyrstikkbakken og brua over jernbanen for å øke tilgjengeligheten og sikre en trygg og mer attraktiv forbindelse. Dette vil bidra til at turveien føres frem nærmere Alna i Brynområdet enn hva som er tilfelle nå. Forarbeid for denne turveistrekningen er utført i forbindelse med prosjekt 2.2.8.10 *Smalvollveien ved Tvetenbrua*, som tar for seg hele strekningen gjennom Brynområdet. Forprosjektet ble ferdigstilt i begynnelsen av 2012. Basert på forprosjekt som ble gjennomført i 2012, vil BYM i 2013 etablere en kortere strekning av turvei D10 i Brynområdet.

**GDS-NR. 2.2.5.11 TURVEI D15 GJENNOM
BREDTVETOMRÅDET - PLANLEGGING OG
GJENNOMFØRING**

Tiltaket er avviklet. Intensjonen var å bygge en turveistrekning gjennom Bredtvetområdet for å få en fullverdig turvei mellom Trondheimsveien og eksisterende turvei D6. Prosjektet er avviklet grunnet uavklarte forhold med grunneier (Statsbygg) og mangel på ressurser for oppfølging i Bymiljøetaten. Totalbudsjettet er 2 mill. kr., hhv. 0,65 mill. statlige og 1,35 mill. kommunale GDS-midler. 1,5 mill. kr. til er omdisponert til Kulturetatens prosjekt GDS.nr. 2.3.1.09 *Nordre Lindeberg gård* og 0,5 mill. kr. til GDS. nr. 2.2.16.10 *Verdensparken*

**GDS-NR. 2.2.6.11 TURVEI 15, GRØNN TVERRAKSE -
PROSJEKTERING**

Tiltaket omhandler strategisk sikring av arealer for å etablere en sammenhengende grønnstruktur mellom Østmarka og Lillomarka. I 2011 ble det besluttet å sikre areal ved Lindebergbekken, slik at turveien kan etableres på ønskelig sted. Planforslag ble ferdigstilt ved utgangen av 2012, og det forventes nå avklaring fra investeringsavdelingen i Bymiljøetaten vedrørende mulig makeskifte med borettslag før oversendelse til PBE. Reguleringen beregnes ferdig i løpet av vinteren 2013.

**GDS-NR. 2.2.7.11 TURVEI D16 SMALVOLLVEIEN/YTRE
RINGVEI - GJENNOMFØRING**

Hensikten med tiltaket er å bygge en turvei mellom Smalvollveien/Smalvollen og Ytre Ringvei og knytter turvei D10 langs Alna ved Smalvollen sammen med boligområdene på Tveita og videre ut i Marka. Detaljprosjektering ble utført i 1. tertial 2012. Arbeid med bygging av turveien er i gang og forventes ferdigstilt sommeren 2013.

**GDS-NR. 2.2.8.11 TEISENPARKEN -
GJENNOMFØRING**

Tiltaket er ferdigstilt. Opprusting av parken er et av flere prioriterte tiltak i forprosjektrapport fra februar

2009. Tiltak som er gjennomført, er: oppgradering av gangveier, belysning, opparbeidelse av møteplasser, skatebane og beplantning. Det gjenstår anskaffelse av benker, søppelkasser, skateelementer. Bydel Alna er i dialog med Bymiljøetaten om finansiering av manglende elementer.

Totalbudsjett er 2,259 mill. kr., hhv. 1,259 mill. statlige og 1 mill. kommunale GDS-midler. Det er regnskapsført 2,413 mill. kr. Merforbruket er dekket gjennom ordinære midler i bydelen.

**GDS-NR. 2.2.1.12 ROMMENSLETTA SKULPTURPARK -
GJENNOMFØRING**

Hovedmålet er å bidra til å oppgradere arealer for park- og friluftsliv med tilrettelegging av 3-6 skulpturer (temporær utstilling). Rommensletta skulpturpark er en opparbeidelse av brakkarealet rundt Sneglehuset og har vært fulgt opp gjennom Områdeløft Haugenstuas handlingsplaner fra 2010. Skulpturparken ble ferdig prosjektert i 2012. Prosjektering og konkurranse for bygging er gjennomført. Kontrakt er inngått, og prosjektet planlegger ferdigstilling i september 2013.

Delmål 3: Vern og bruk av kulturminner og miljøer

**GDS-NR. 2.3.9.07 BAKÅS SKANSER -
FORVALTNINGSPLAN**

Tiltaket er ferdigstilt. Prosjektet omfatter utarbeidelse av forvaltningsplan og rapport om pedagogisk bruk av skansene for skolene i Groruddalen. Forvaltningsplanen var ferdig i 2009. Målsetningen er sikring eller vern av kulturminner og kulturmiljø.

Forvaltnings- og skjøtselsplan og rapport er utarbeidet. Bymiljøetaten har fått midler til istandsetting av skansene. Totalbudsjettet er 0,35 mill. kr. statlige GDS-midler. 0,01 mill. kr. er overført til istandsetting av skansene og rapporteres på under GDS.nr. 2.3.5.11 *Bakås skanser - gjennomføring av skjøtselsplan.*



Foto Inge-Lise Pettersen.



På Isdammen kan du blant annet leie kano og grille pølser i lavvo. Tilbudet inngår i bydelens folkehelsearbeid. Foto Bydel Bjerke.

GDS-NR. 2.3.1.09 NORDRE LINDEBERG GÅRD - RESTAURERING

Bakgrunn for tiltaket er behovet for rehabilitering av våningshuset på gården. Målsetningen er å sikre Nordre Lindeberg gård som kulturmiljø og attraktivt møtested gjennom bruk. Ønsket er at gården blir en enhet der alle bygningene tas i bruk slik at utnyttelsen av anlegget øker ut over dagens aktiviteter. Restaureringsarbeidet ferdigstilles i april 2013. Tiltaket fikk en ekstrabevilgning på 1,5 mill. kr. i 2012 grunnet funn av store råteskader. Kulturetaten antar at tiltaket vil få et merforbruk på ytterligere 1. mill. kr. grunnet forsinkelse i arbeidet. Etaten arbeider med å finne en løsning på hvordan dette skal finansieres.

GDS-NR. 2.3.2.09 BÅNKALL GÅRD - REHABILITERING AV HOVEDHUS OG DRENERING AV GÅRDSTUN

Målsetning med rehabiliteringstiltak er å sikre gården som et historisk møtested for Oslo med utvidet bruk av anlegget. Tiltaket skal bidra til ivaretagelse av et viktig kulturmiljø. Det ble i 2012 utarbeidet en helhetlig plan for rehabiliteringsarbeidet. Det som gjenstår i etappe 1 er bærekonstruksjonen i driftsbygningen, tak på våningshus og driftsbygningen samt diverse arbeider utvendig. Til tross for bruk av tilskuddsmidler for 2012 og 2013 gitt i budsjettet til Kulturetaten og omdisponering av midler til forprosjekt for ny adkomst, er prosjektet underfinansiert med 1,2 mill. kr. Årsaken til dette er at det ble oppdaget kritiske konstruksjonsproblemer i grunnen på låven. Kulturetaten hadde valget mellom å stoppe arbeidet eller sikre grunnen. Siden sikring av konstruksjoner i låven var nødvendig uavhengig av bruksformål i fremtiden valgte etaten å bruke tildelte midler fra etappe 1 til å bygge opp nedrast murkonstruksjon. Kulturetaten jobber med å finne løsninger på finansiering av dette.

Det er bevilget 0,5 mill. kr. i 2013 for å utarbeide en KVV for restaurering av låven med budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan. Etaten må søke midler på dette tiltaket i 2014.

GDS-NR. 2.3.2.10 ÅRVOLL ISDAM - REHABILITERING

Tiltaket innbefatter restaurering av bygninger og er et samarbeid mellom Bydel Bjerke, ulike etater og frivillige organisasjoner. Målsetningen med tiltaket er å utvikle Øvre isdam til en møteplass med friluftsliv som ramme for aktiviteter, og samtidig synliggjøre og ivareta stedet som kulturminne.

Høsten 2010 ble det utarbeidet en mulighetsstudie for prosjektet som beskrev tiltak og inneholdt plan for restaureringsarbeidet. Tiltak som er ferdigstilt, er: ombygging av annekset med toalett, restaurering av hønsehus, våningshus og hovedbygningen. Bygningene er tatt i bruk av organisasjoner, beboere og bydelenes tjenester. Bygging av naturlekeplass startet i 2012 og vil avsluttes i 2013. Det er også innkjøpt lavvo, kanoer og annet friluftsutstyr til utlån.

GDS-NR. 2.3.3.10 LONDON PARK (tidligere Steinbruddet kulturhus/park) - MULIGHETSSTUDIE

Tiltaket omfatter å etablere en park ved Steinbruddet kulturhus. Parken er tenkt som en møteplass med hovedvekt på universell utforming. Bruken av området rundt kulturhuset har hatt en kraftig økning. Det er ønskelig å etablere en åpen plass med benker, bord og belysning, eventuelt på et senere tidspunkt gjøres til en kunspark i samarbeid med kulturhuset.

Det er gjennomført en mulighetsstudie med en totalkostnad på 7 mill. kr. Bydelen har i 2013 fått bevilget 0,5 mill. kr. til å utarbeide en KVV med budsjett, finansieringsplan og fremdriftsplan.

GDS-NR. 2.3.4.10 ARVESET GÅRD - MULIGHETSSTUDIE

Tiltaket er ferdigstilt. Gården forfaller og flere av bygningene er ikke i bruk. Boligbygg jobber videre med eiendommen og ønsker å utvikle den i tråd med mulighetsstudiet.

Totalbudsjettet er kr. 201 200, hhv. 0,15 mill. statlige GDS-midler og 0,051 mill. ordinære kommunale midler. Det er regnskapsført kr. 181 641. Restbeløpet søkes overført GDS.nr. 2.3.1.12 *skilting av kulturminner*.



Fra nettstedet www.oppdaggroruddalen.no

GDS-NR. 2.3.7.10 GRORUD SAMFUNNSHUS - MULIGHETSSTUDIE

Tiltaket er ferdigstilt. Det er fortsatt behov for 0,18 mill. kr. for å komme frem til et endelig og riktig mulighetsstudie. Ansvar for å skaffe til veie midler ligger hos Grorud samfunnshus AL. Bydelen har valgt å avslutte prosjektet og vil i 2013 søke om å omdisponere midlene til investering i det kommende Steinhoggermuseet i Grorudveien 3. Totalbudsjettet er 0,4 mill. kr., kommunale GDS-midler. Det er regnskapsført kr. 373 419. Resterende midler vil bli søkt omdisponert.

GDS-NR. 2.3.2.11 BÅNKALL GÅRD - NY ADKOMST

Tiltaket er avvirket. Prosjektet ses i sammenheng med restaurering av gården. Midlene 0,2 mill. kr. overføres til GDS.nr. 2.3.2.09 Bånkall gård.


GDS-NR. 2.3.4.11 DIGITALT KULTURKART

Tiltaket er ferdigstilt. Det er utarbeidet et digitalt

kulturminneatlas for Groruddalen som viser frem mangfoldige og spennende historier og styrker dalens historieforståelse. Oslo Museum, Byarkivet, Groruddalen historielag og Plan- og bygningsetaten har bidratt i prosjektet. Prosjektet har i tillegg samarbeidet med videregående skoler i Groruddalen, og elevene har laget filmer om kulturminner. Totalbudsjettet er 0,662 mill. kr. statlige GDS-midler. Det er regnskapsført kr. 618 857. Restbeløpet er overført DIVE-analyse for områdeløft Veitvet/Sletteløkka og rapporteres på i PG3A.

GDS-NR. 2.3.5.11 BAKÅS SKANSE - SKJØTSELSPLAN

Tiltaket består i å utføre diverse skjøttselarbeid og skilting ved skansene i henhold til utarbeidet forvaltings-, vedlikeholds- og skjøtseplan. All vegetasjonsrydding ble utført høsten 2012, og forarbeid for diverse skilting ble igangsatt. Tiltaket planlegges å ferdigstilles våren 2013.



Kjøkkenet i Grorudveien 3 er restaurert, og fremstår slik man antar at det så ut da huset ble bygd på 1920-tallet. Foto Marianne Gjerv.

GDS-NR. 2.3.6.11 GRORUDVEIEN 5

Tiltaket er ferdigstilt. Det ble oppdaget store fuktskader da arbeidet startet i 2008, og bygningen måtte derfor strippest. Huset er totalrestaurert med blant annet etablering av en bolig med atelier eller utleie til frivillige i 2. etasje og møterom/kafé med tilhørende storkjøkken i 1. etasje. Bydel Grorud ønsket at det skulle installeres et storkjøkken i Grorudveien 5 slik at man kunne få inn en næringsaktør til kafédrift. Merkostnadene beløper seg til 0,75 mill. kr. Ved kontraktsinngåelse med en næringsaktør vil tilbakebetaling av disse midlene inngå som et punkt. Midlene kan brukes til å opparbeide hageanlegget, eller søkes omdisponert til finansiering av rehabiliteringen av Bånkall gård.

Totalbudsjett er 6,8 mill. kr., hhv. 2,8 mill. statlige og 4 mill. kommunale GDS-midler. Det er regnskapsført 5,629 mill. kr. Mindreforbruket søkes omdisponert til hageanlegg i Grorudveien 3 og 5, eller til restaurering av Bånkall gård.

GDS-NR. 2.3.1.12 SKILTING AV KULTURMINNER I GRORUDDALEN - GJENNOMFØRING

Tiltaket består av å produsere skilt med bilde og tekst som skal settes opp ved Akergårdene Lindeberg, Bånkall, Tveten, Årvoll og Fossum gård. Formålet er å formidle Akergårdene som viktige kulturminner og historiske møtesteder.

2.3.4 Delmål 4: Idrettsanlegg/tilrettelegging for fysisk aktivitet

GDS-NR. 2.4.1.08 KUNSTISBANE LØRENHALLEN - GJENNOMFØRING

Tiltaket innebærer forberedende arbeid for en kunstisbane i nærmiljøet. Det ble i 2012 utført arkeologiske undersøkelser. Bymiljøetaten inngår i 2013 rammeavtale med konsulenter for blant annet kuldeanlegg. Tiltaket settes på vent inntil forprosjekt er ferdigstilt, og kostnader for gjennomføring er beregnet. Det er ønskelig å søke på midler på et senere tidspunkt.

Etaten beholder 0,25 mill. kr. til revidering av forprosjekt og tilpasning til reguleringsformål, de resterende kr. 1 720 794 er overført til prosjekt 2.4.2.12 *Grorud idrettspark*.

GDS-NR. 2.4.1.11 KUNSTISBANE STOVNER - PROSJEKTERING

Tiltaket består av å fullføre oppstartet prosjektering av kunstisflaten. Forprosjekt er ferdigstilt. Bymiljøetaten vil i 2013 kvalitetssikre forprosjektet internt.

GDS-NR. 2.4.5.11 HAUGERUD IDRETTSANLEGG - GJENNOMFØRING

Tiltaket er ferdigstilt. Initiativet til tiltakene har kommet fra Haugerud IF. Det omfatter skatebanen som ble ferdigstilt i 2010, og en vesentlig oppgradering av områdene rundt kunstgressbanen på Haugerud. Videre er det etablert ny tennisbane, streetbasketbane, tribune for fotballbanen og oppgradering av asfaltbane. Målsetningen var å nå flere barn og unge til fysisk aktivitet, og tilbakemeldingene bydelen har fått tilsier at idrettsanlegget på Haugerud tas i bruk av flere. Idrettsforeningen opplever nå vekst i medlemstallet, og det rapporteres om at den «ikke-organiserte» aktiviteten i uteområdet øker. Tiltaket støtter også opp om tiltak i Programområde 4 gjennom rekrutteringsprosjektet *Flere på banen*. Totalbudsjettet er 1,548 mill. kr., hhv. 0,8 mill. statlige og 0,333 mill. kommunale GDS-midler. 0,1 mill. kr. er kommunale nærmiljømidler. Det er regnskapsført 1,580 mill. kr. Merforbruket dekkes av bydelens ordinære midler.

GDS-NR. 2.4.1.12 STIG SKOLE

Tiltaket består av opparbeidelse av løpebane og ballbane. Tiltaket er i 2012 ferdig kontrahert og klar for produksjon. Oppstart ca. 1. april 2013.



GDS-NR. 2.4.2.12 VESTLI SKOLE

Tiltaket består av opparbeidelse av komplett leke-/idrettsområde med lekeapparater og kunstgressbane. Tiltaket er i 2012 ferdig kontrahert og klar for produksjon. Oppstart ca. 1. april 2013.

GDS-NR. 2.4.3.12 FYSISK AKTIVITET - MOBILISERENDE TILTAK

Tiltaket er ferdigstilt. Friske midler ble bevilget for å iverksette gode prosjekter for å øke fysisk aktivitet og mobilisere til bruk av ferdigstilte tiltak. I 2012 ble det bevilget 0,25 mill. kr. til å arrangere lysvandring langs Alnaelva og kr. 0,05 mill. til danseforestilling ved Isdammen på Årvoll. Begge arrangementene trakk mye folk og bidro til å synliggjøre turmuligheter. Totalbudsjett 0,3 mill. kr., statlige GDS-midler. Det ble regnskapsført 0,3 mill. kr.

GDS-NR. 2.4.4.12 GRORUD IDRETTSPARK/AKSE - PROSJEKTERING

Tiltaket har fått ordinære midler til gjennomføring av idrettsbanen. Det er ønskelig å se Grorudparken, idrettsanlegget og arbeiderboligene i Grorudveien 3 og 5 i sammenheng. I reguleringsplanen og etappeplanen for Grorud park ligger det inne en akse som skal være frekomståre fra arbeiderboligene til parken gjennom idrettsparken. Det er omdisponert midler fra GDS-nr. 2.4.1.08 *Kunstisbane Løren* til prosjektet.



«I 2012 ble det bevilget 0,25 mill. kr. til å arrangere lysvandring langs Alnaelva og kr. 0,05 mill. til danseforestilling ved Isdammen på Årvoll.»



Lysvandringen langs Alnaelva imponerte både små og store. Foto Linn Førland.

2.5 Bydelsrusken Groruddalen

Tabell 3

	NAVN PÅ TILTAK	MOTTAKER AV MIDLER	OPPSTART/SLUTTDATE	KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET	BUDSJETT
1	BydelsRusken Groruddal (tidligere Aksjon vakrere Groruddalen)	Bydel Alna Bydel Bjerke Bydel Grorud Bydel Stovner	2010-2011 Videre-ført 2012-2016 Tiltak pågår	BydelsRusken Groruddal er et lavterskel arbeidstreningstiltak for kvalifisering til ordinært arbeidsliv, der det bl.a. sysselsettes personer som rekrutteres fra ulike programmer i regi av NAV. I 2012 har til sammen 76 personer deltatt i tiltaket i de fire bydelene. Arbeidsgruppene, som er organisert med én gruppe innen hver bydel, driver med grøntvedlikehold og rydding i egen bydel i tillegg til at de fire arbeidsgruppene gjennom sesongen samarbeider om større fellesprosjekter de har gjennomført på rundgang i bydelene. I 2012 har BydelsRusken hatt fellesaksjon langs Tokerudbekken i bydel Stovner. Øvrige arbeidsoppgaver for arbeidsgruppene er: Opprydding av fellesområder i dalen som ligger «brakk», holde vegetasjon og søppel borte fra adkomster og stier, lette befolkningens tilgang til dalens kollektivknutepunkt. Om vinteren blir trapper og skøytebaner holdt frie for snø og søppel fjernet kontinuerlig gjennom året.	2010: 3.416.000 2011: 3.766.000 2012: 5.300.000 (1325 000 pr. bydel) Totalt hittil: 12.482.000
2	«Facelift 2010»	Transport-bedrifter ved Alnabru-terminalen: Mantena as Grorud, Tollpost Globe CargoNet as	2010-2011 ferdig	Samarbeidsprosjekt mellom transportbedriftene: Mantena as Grorud, Tollpost Globe, CargoNet as og Posten/Bring ved Alnabru-terminalen, om opprydding og beplantning langs vei og inne på egne områder for å skjerme innsyn til næringsområdene samt for å forbedre/forskjønne utemiljøet ved de enkelte bedriftene. Posten/Bring krever ikke refusjon (kr. 150.000) da de ikke fikk gjennomført sin del i prosjektperioden. Utbetalt 340.000 til Mantena og Tollpost. Venter faktura på kr. 400.000 fra CargoNet.	740.000
3	Skjerming i Terminalveien	Schenker	2010-2011 ferdig	Tilskudd til opprydding på «Hundetomta» og skjerming/ beplantning langs Terminalveien.	257.000
4	Skjerming av containertomt langs E6	EBY	2010-2011 ferdig	Beplantning for å skjerme innsyn til containerrekke ved Ulvensplitten. Utbetalt 629 567 kroner for prosjekt 4 og 5 (både containertomt og Brobekkveien).	630.000
5	Brobekkveien	EBY	2010 -2011 ferdig	Tilskudd til beplantning og opprydding langs veiareal.	Budsjett inngår i prosjekt 4
6	Refstadvn. / Økernvn.	EBY	2010 -2011 ferdig	Tilskudd til beplantning og opprydding langs Refstadvn. / Økernveien.	106.000
7	Hafslund Nett: Belysning ved Haugenstua	Bydel Stovner	2010 -2011 ferdig	Tilskudd til belysningsanlegg langs Garver Ytterborgs vei til Maria Dehlis vei. Områdesatsning på Haugenstua. I tillegg til tilskudd fra AVG har BYM bidratt med 425.000 kroner til tiltaket.	650.000

	NAVN PÅ TILTAK	MOTTAKER AV MIDLER	OPPSTART/SLUTTIDATO	KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET	BUDSJETT
8	Oppgradering langs Alnaparkveien	Næringsforening Nedre Furuset	2010 –2011 ferdig	Tilskudd til Næringsforeningen nedre Furuset for opprydding og beplantning næringseiendommer langs Alnaparkveien. I tillegg til tilskudd til private fra AVG har BYM bygget ny vei med fortau og kantstein. Pris: 1.2 mill. Fase 1 av arbeidet er ferdigstilt. Fase 2 av arbeidet er under vurdering/planlegging og innebærer bygging av en snuplass i enden av Alnaparkveien. Arbeidet forutsetter at BYM har budsjett til dette arbeidet. Det er planlagt beplantning av trær vår 2013.	430.000
9	Oppgradering langs Alnaparkveien		2011–	Beplantning langs Alnaparkveien. Se også prosjekt 8. Midler avsettes til 2013, til evt. 2. del av veibygging i regi av BYM er ferdigstilt.	158.000
10	Produksjon av skilt til ryddede steder i Groruddalen	BYM	2011 ferdig	BYM har produsert 30 skilt som skal settes opp på ryddede steder i Groruddalen. Skiltene har tekst som informerer om at tømming av søppel er ulovlig, og informasjon om nærmeste gjenbruks-/avfallsstasjon.	33.750
11	Taggejerning	Stopp Tagging as. Kontrakts-avtale med BYM	2010–2011 ferdig	Fjerning av tagging i 10 underganger/kulverter, murer og trapper. Det er utbetalt faktura for til sammen 448.000 kroner	450.000
12	Oslo Lastebilservice: Rydding og beplantning	Oslo Lastebil-service	2011	Tilskudd til opprydding, beplantning og skjerming av næringseiendom.	20.000
13	Rommen-fyllinga / Haavard Martinsens vei	EBY	2010–2011 ferdig	Tilskudd til opprydding og beplantning langs Rommen-fyllinga og Haavard Martinsens vei	237.000
14	AGA/Tollpost: Strømsveien	AGA / Tollpost	2011–2012 ferdig	Tilskudd til oppgradering og beplantning langs veistrekning. Fakturering etter utført arbeid	47.000
15	Tokerud Varmesentral	Tokerud Varme-sentral	2010–2011 ferdig	Tilskudd til utsmykking og belysning av pipen på varmesentralen. Tiltaket inngår i en større lokalmiljø-satsning på Haugenstua som bla går ut på å redusere opplevelser av utrygghet og bedre estetiske kvaliteter på utemiljøet.	75.000
16	Brosjyre: Gjenbruk til isolasjons-matter/ Isomat	Fritjof Johansen	2011 ferdig	Tilskudd til en brosjyre til bruk for oppstart av næringsvirksomhet: Produksjon av isolasjonsmatter som baserer seg på gjenbruk av tekstil.	140.000
17	Kjelsrud gård	Kjelsrud gård	2011–2012 ferdig	Tilskudd til gjerde for å skjerme innsyn til næringseiendom. Fakturering etter utført arbeid	70.000
18	Admin.		2009–2012 ferdig	Gjelder trykking av foldere, brosjyrer, utsending av brev og rapporter for Aksjon vakrere Groruddal, samt bevertning i styringsgruppemøter AVG.	37.000
19	Vakre Veitvet	Bydel Bjerke	2011–2012 ferdig	Tilskudd til lokal kampanje mot forsopling av utemiljøet i området Veitvet-Slettelokka. Områdenes borettslag/sameier, skole, barnehager, fritidsklubb og lokale lag og foreninger inviteres til en omfattende innstas høsten 2011.	270.000
20	Brumodell	Arkitekt Arne Eggen	2012 ferdig	Presentasjon av modell av gangbru	40.000

	NAVN PÅ TILTAK	MOTTAKER AV MIDLER	OPPSTART/SLUTTDATE	KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET	BUDSJETT
21	Konsulenter	Vista as	2011–2012 ferdig	Konsulent-/sekretariatsarbeid i tilknytning til AVG-prosjektarbeid. Sekretariatsarbeid, rapportskriving	205.000
	Trykking av rapporter	Allkopi	ferdig	Trykking av sluttrapport for AVG	14.200
22	Alf Bjerkes vei		2012–	Tiltak er under vurdering/planlegging: Plante trær mellom veien og hovedbanen. Samarbeid mellom BYM og JBV	450.000 Ikke utbet. Avsettes for evt. utbet. i 2013
23	Grorud Jernbane- stasjon		2012–	Tiltak er under vurdering/planlegging: Området nord for stasjonen trenger oppgradering (kantstein, beplantning), bussholdeplassene bør samles og oppgraderes (leskur) og taxi vurderes flyttet. Ansvar: BYM/JBV/ROM	700.000 Ikke utbet. Avsettes for evt. utbet. i 2013
24	Grorud T-banestasjon		2012–	Tiltak er under vurdering/planlegging: Hele stasjonsområdet, inkludert undergang til bussterminal, er tagget, forsøplet og forfalt. Behov for oppgradering eller oppussing. Ansvar: KTP eiendom/Senteret	100.000 Ikke utbet. Avsettes for evt. utbet. i 2013
25	Stovner T-banestasjon		2012–	Tiltak er under vurdering/planlegging: Området utenfor stasjons- og senterområdet er forfalt og forsøplet. Behov for oppgradering og beplantning. Ansvar: KTP eiendom/Senteret	200.000 Ikke utbet. Avsettes for evt. utbet. i 2013
26	Brobekkveien		2012–	Tiltak er under vurdering/planlegging: Samarbeid med Næringsforeningen Oslo Nord: Skjerming, beplantning, oppgradering	500.000 Ikke utbet. Avsettes for evt. utbet. i 2013

3 STATUS FOR ORDINÆRE TILTAK

Av ordinære kommunale midler er det i 2012 brukt henholdsvis 14 mill. kr. fra Vann- og avløpsetaten og 0,83 mill. kr. fra Bymiljøetaten, totalt 14,83 mill.kr. Av prosjekter gjennomført over ordinære budsjetter, er 2

tiltak ferdigstilt i 2012, og 3 tiltak planlegges ferdigstilt i 2013. Ett av tiltakene gjennomføres kontinuerlig hvert år.

3.1 Ordinære tiltak

Tabell 3

NR.	PROSJEKTER	PROSJEKTANSVARLIG	STATUS
1	Grorud kunstgressbane	BYM	Planlagt oppstart bygging sommeren 2013.
2	Utredning idrettshall Grorud og Årvoll	BYM	Igangsatt KVV i Bymiljøetaten i 2013
3	Høybråten kunstgressbaner	BYM	Ferdigstilles i 2013
4	Ammerudveien bekkeåpning	BYM	Prosjektering ble ferdigstilt i 2012. Bygging videreføres som GDS-prosjekt iht fordeling av investeringsmidler i 2013 og rapporteres på i kap. 3.
5	Rehabilitering bordgang turvei D8.	BYM	Ferdigstilt
6	Utarbeidelse av plan for Lillomarka idrettspark	BYM/BGR	Reguleringsplanarbeid pågår
7	Utarbeidelse skisseprosjekt for forlengelse av Jerikobakken	BYM	Planlagt videreført i 2013
8	Bygging av idrettslekeplass ved Høybråten tennisbane	BYM	Ferdigstilt
9	Kunstgressbane Stubberudmyra	BYM	Rehabilitering i 2013
10	Utarbeide kulturminnegrnlag for to prioriterte kulturmiljø i Groruddalen (prioritert i HUGen)	BYA	Det har ikke vært utarbeidet noen kulturminnegrnlag i 2012.
11	Starte arbeidet med å sikre og synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel (punkt i Handlingsprogrammet for 2010–2013)	BYA	Byantikvaren jobber stadig med å føre nye områder og objekter inn på Gul liste, for på denne måten og sikre kulturminnene. Eksempler fra 2012 er Lunden kloster, trafostasjon på Linderud, Tonsenjordet 1950-tallsmiljø og Tonsenhagen senter. Bjerke videregående skole, Linderud skole og bad, Haugen skole, Ellingsrud skole, Vestli skole, Tiurleiken skole, Tveita skole/Hellerud videregående skole.
12	Registrering av småhusområder i Groruddalen, og påfølgende oppføring på gule lister	BYA	Småhusområde langs Trondheimsveien ved Rommen er kartlagt og en eiendom er ført inn på Gul liste. Det er gjennomført innledende undersøkelser for å kartlegge hyttebebyggelse på Ammerudskogen, Rødtvet og Hellerud.
13	Fornyng av avløpsnett for å redusere forurensing av Alna	VAV	Gjennomføres kontinuerlig hvert år

«Tiltakene har bidratt til åpning av nye elvestrekninger og bedre vannkvalitet, supplering av turveinettet som gir muligheter for miljøvennlig transport og fysisk aktivitet, utvikling av Akergårdene som spennende møtesteder og etablering av nye leke- og idrettsanlegg som tilrettelegger for fysisk aktivitet.»



Kalbakken bru i Grorudparken er en av landets eldste steinhvelvsbruer.

Foto Roy Tjomsland.

4 FERDIGSTILTE TILTAK I PERIODEN 2007–2012

I Programområde 2 er det i perioden 2007-2012 blitt gjennomført 101 tiltak, 70 av tiltakene er finansiert over ekstraordinære groruddalsmidler, og 31 tiltak er finansiert over ordinære kommunale midler. Tiltakene har bidratt til åpning av nye elvestrekninger og bedre vannkvalitet, supplering av turveinettet som gir muligheter for miljøvennlig transport og fysisk aktivitet, utvikling av Akergårdene som spennende møtesteder og etablering av nye leke- og idrettsanlegg som tilrettelegger for fysisk aktivitet.

I perioden 2007-2012 avsatte Miljøvern-departementet til sammen 149 mill. kr. og Oslo kom-

mune 66 mill. kr. til Programområde 2. I tillegg har Miljøverndepartementet i 2009, som ledd i regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen, satt av 30 mill. kr. Av disse midlene er 20 mill. kr. satt av til tiltak for å forbedre kvalitet og sammenheng i grønnstruktur og turveier. De resterende 10 mill. kr. er satt av til *Bydelsrusken Groruddalen* for sammen med næringslivet å rydde opp i utemiljøet og bidra til bedre tilgjengelighet til miljøvennlig transport i næringsområdene i dalbunnen. Kommunen vil over en fireårsperiode (2012-2015) bruke 11,6 mill. av ordinære kommunale midler til bydelsrusken.

Liste over ferdigstilte tiltak fordelt etter delmål

DELMÅL 1

Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs Alna og mest mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden.

1. Hølaløkken
2. Alna gjennom terminalområdet, reguleringsplan
3. Grorud stasjonsområde – planforslag
4. Leirfossen, åpning av Alna
5. HC-WC ved Steinbruvannet
6. Grorud stasjonsområde – planarbeid
7. Vesletjern, bekkeåpning, demning
8. Rehabilitering av Refstadbekken
9. Åpning av bekker på Furuset – mulighetsstudie

DELMÅL 2

Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder.

10. Turvei D8 Nordtvet gård
11. Turvei D10 Grorud stasjon/Grorudveien
12. Turvei D10 Alnaparken/Grorud stasjon nordre del
13. Turvei D10 langs Fossumbekken
14. Turvei D10 Kulvert under jernbanen ved Haugenstua
15. Turvei D10 langs Terminalveien
16. Turvei D6 Brobekkveien/Økernveien/Refstadveien
17. Turvei D6 Veitvet/Hølaløkken
18. Turvei D10 Rommensletta med Sneglehuset
19. Turvei D9 Leirfossen
21. Turvei D2 Kildeveien/Mons Søviks plass
22. Turvei D10 Svartdalen under hovedbanen og langs Fagerlia
23. Turvei D15 langs Veitvetbekken
24. Turvei D10 Rehabilitering av delstrekninger
25. Turvei D16/Ytre Ringvei, krysningspunkt – mulighetsstudie
26. Turvei D8 Rehabilitering bordgang turvei
27. Furuset kulturpark
28. Furuset aktivitetspark
29. Orienteringskart for boligområde
30. Alnaparken ridesenter
31. Strategisk grønnstrukturplan – planarbeid
32. Vestlitorget
33. Bjerke nærmiljøsent
34. Tusenårsstedet, parkanlegg
35. Stovnerparken
36. Alnaparken, frisbeegolf og skilting
37. Årvolldammen parkområde
38. Alna ridebane og ridestier
39. Rehabilitering eksisterende anlegg
40. Tur- og sykkelvei Vestli-Gamlebyen, fjerning av hindringer
41. Brynsengfaret park
42. Treplanting
43. Liastua VA-anlegg
44. Grønn tverrforbindelse i Groruddalen – mulighetsstudie
45. Smalvollveien v./Tvetenbrua, Fyrstikkbakken – mulighetsstudie
46. Turvei D8 Vesletjern/Kristian Bogeruds vei
47. Teisenparken

DELMÅL 3


Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtested.

48. Bakås skanser – forvaltningsplan
49. Bånkall gård og kulturlandskap, skjøtels- og forvaltningsplan
50. Kulturminnegrunnlag for Kabelgaten – planarbeid
51. Tilstandsvurdering for Grorudveien 3 og 5 – mulighetsstudie
52. Restaurering av brenneribygningen på Tveten gård
53. Rehabilitering hage rundt våningshuset på Nordre Lindeberg gård
54. Nedre Fossum gård, rehabilitert hageanlegg
55. Nordtvet gård, restaurering
56. Årvoll gård, bygging av ny låvebru
57. Arveset gård, tilstandsrapport/bruksanalyse
58. Arveset gård mulighetsstudie
59. Arkeologisk undersøkelse ved Furuset kulturpark
60. Linderud gård – mulighetsstudie
61. Kulturkart/veiviser
62. Årvoll gård, kulturscene
63. Mitt moderne kulturminne – rapport
64. Kulturminnegrunnlag for Bryn
65. Kulturminnegrunnlag for Aker sykehus
66. Vandreutstilling om drabantbyene
67. Kulturhistorisk analyse av Haugenstua
68. Kulturhistorisk analyse av Veitvet/Sletteøkken
69. Årvoll gård, sikring av bygninger
70. Linderud gård, utredning for bruk og bevaring – rapport
71. Grorudveien 3, restaurering
72. Gamle Furuset skole, rehabilitering
73. Nordre Lindeberg gård, flytting av trafostasjon
74. Grorud samfunnshus – mulighetsstudie
75. Digitalt kulturkart
76. Grorudveien 5, restaurering

DELMÅL 4

Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

77. Løren idrettspark, kontorbygg
78. Høybråten klubbhus, rehabilitering
79. Årvoll skytebane og skytehall, rehabilitering
80. Veitvet idrettsanlegg, lysmaster
81. Orrmyr borettslag, ballbinge
82. Apalløkken idrettshall, rehabilitering
83. Jerikoveien minikunstgressbane
84. Bygging av idrettslekeplass v./Furuset Forum
85. Øvre Fossum gård, klubbhus, ridebane
86. Rommensletta, rehabilitering cricketbane, baseballbane, gressfelt for minifotball
87. Linderudkollen, utbedring/rehabilitering
88. Idrettslekeplass ved Humleby
89. Bygging av kunstgressbane ved Rommensletta
90. Prosjektering av kunstgressbaner i Bydel Grorud
91. Prosjektering av kunstgressbaner i Bydel Stovner
92. Prosjektering av kunstisbane/minirink i hver bydel
93. Tveita skole, leke- og idrettsplass
94. Kunstisflate Furuset Forum
95. Stovner skole, opparbeidelse av skolegård
96. Rødtvet skole, opparbeidelse av skolegård
97. Tiurleiken skole, opparbeidelse av skolegård
98. Tusenårsstedet
99. Kunstisflate Stovner – prosjektering
100. Haugerud idrettsanlegg med tennisbane, street/ballbane og tribuner
101. Bygging av idrettslekeplass ved Høybråten tennisbane



Alnaelva. Foto Marianne Gjørv.

HANDLINGSPROGRAM 2010–2013

A person is performing a fire dance, holding a flaming torch. The background is dark, and the fire creates bright, colorful light trails in red, yellow, and green. The person is wearing a dark, sleeveless top. The overall atmosphere is dynamic and artistic.

I 2013 vil Programområdet arbeide videre med tiltakene som bidrar til å nå delmålene knyttet til åpning av Alna med sidebekker, grønnstruktur, idrett, biologisk mangfold og kulturmiljø. Å se sammenhengen mellom tiltak, strategier og mål har vært viktig for å vedta gode veivalg og prioriteringer. Dette arbeidet følges opp videre i satsingen. I 2013 vil programgruppen utarbeide nytt handlingsprogram for perioden 2014–2016.



1 INNLEDNING

Handlingsprogram for Programområde 2 Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø 2010-2013 viser prosjekter som er planlagt gjennomført i hele perioden. Programmet rulleres årlig og det utarbeides en årlig tiltaksliste. I 2013 arbeides det videre med områdets hovedstrategier for å utvikle en sammenhengende grønnstruktur og turveier på langs og tvers av dalen, bygging av fire bydelsparker og videreutvikling av Akergårdene som attraktive møteplasser. For å få en god totaloversikt over tiltak som planlegges og gjennomføres i Groruddalen, består handlingsprogrammet også av tiltak finansiert over ordinære kommunale budsjetter.

2 LANGSIKTIG HOVEDMÅL FOR GRORUDDALEN

Satsingens hovedmål er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det skal utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag og næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

2.1 Mål for Programområde 2 Alna, Grønnstruktur, idrett og kulturmiljø

Programområde 2 har ett hovedmål og fire delmål. Hovedmålet ble vedtatt på Politisk møte i 2007, og reviderte delmål ble godkjent på samarbeidsutvalget i 2013. Delmålene tilsvarer den tematiske inndelingen av programområdet.

Hovedmål

Målet er å styrke Groruddalens blågrønne struktur og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett, og bedre luftkvalitet. Kulturminner skal vernes og brukes, og dalens historieforståelse skal styrkes.

Delmål

1. Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs Alna og mest mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden
2. Grønnstrukturen og turveier skal bli

sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder

3. Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder
4. Det skal legges bedre til rette for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

2.2 Kobling mellom hovedmål og Programområde 2

Groruddalssatsingen tar gjennom fire programområder sikte på å bedre livskvaliteten og levekårene i området. En viktig del av satsingen er å jobbe områderettet og tverrsektorielt for å sikre at tiltak innenfor de ulike programområdene virker sammen og skaper synergieffekter både lokalt og for dalen som helhet. Det er derfor viktig å koble tiltakene innenfor hvert programområde til respektive hovedmål og delmål, og til det langsiktige hovedmålet for satsingen. Groruddalen skal bli et bedre sted for folk å bo. Derfor er det avgjørende å sikre at prioriteringene samvirker med annen innsats, spesielt i områdeløftområdene og andre delbydeler som er prioritert av bydelene pga. dårlige levekår.

Det er en sentral del av hovedmålet å utvikle inkluderende samarbeidsformer mellom ulike aktører. Organiseringen av arbeidet i Programområde 2 bidrar til dette gjennom et godt samarbeid mellom bydelene og etatene. Dette samarbeidet vil videreutvikles i neste periode sammen med borettslag, lokale



organisasjoner og interessegrupper. Et av kriteriene for valg av tiltak for Programområde 2 er å se tiltak i sammenheng i geografiske områder og mot andre programområder. Både Programområde 3, ved områdeløftene, og 4 drar stor nytte av å koble seg opp mot arbeidet i Programområde 2. Lett tilgjengelige og tilrettelagte parker, turveier og idrettsanlegg bidrar til økt livskvalitet, trygghet og folkehelse.

Bydelenes innspill, basert på lokale medvirkningsprosesser, blir nøye vurdert av fagetaten samt sett i sammenheng med innspill fra de andre programområdene.

3 MÅLGRUPPE

Målgruppen for Programområde 2 er alle beboerne i Groruddalen og i tillegg besøkende utenfra. Tiltakene som settes i gang, skal fange opp ulike brukerinteresser og legge til rette for et mangfold av fysiske og sosiale aktiviteter. Eksempler kan være å skape bedre muligheter for gående i form av gode turveier og for uteliv i form av parkområder. Det er en særlig utfordring å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle beboere i dalen, og å utvikle tiltak med lave terskler slik at en også når inaktive grupper. Akergårdene og lokale møteplasser skal være attraktive for befolkningen på tvers av alder og kultur gjennom å utvikle allsidige møtesteder med ulike tilbud og aktiviteter.

4 STRATEGI

Programgruppe 2 vil videreføre arbeidet som ble satt i gang i forrige periode, men legge større vekt på tiltak i og i nærheten av boligområdene. I perioden 2007-2009 ble det gjennomført en rekke tiltak i dalbunnen for å etablere en sammenhengende grønnstruktur og turveisystem, samt i tverrdraget Grorud-Furuset. Målet var å gjøre dalbunnen mer tilgjengelig som rekreasjonsområde. For å få til bruk av disse områdene og binde hele dalen sammen må man i neste periode fokusere mer på tiltak som kan bidra til å binde sammen dalbunn og dalsider, blant annet ved å

bryte de langsgående barrierene som baner og motorveier utgjør. Programgruppen vil også iverksette temporære tiltak og arrangementer for å gjøre tiltakene kjent og mobilisere beboerne til å bruke nye anlegg og tilbud. I perioden 2010-2013 vil det arbeides med følgende *hovedstrategier*:

- Utvikle sammenhengende grønnstrukturer og turveier på langs og tvers av dalen, og å se ulike tiltak i sammenheng i utvalgte geografiske innsatsområder.
- Videreutvikle Akergårdene og andre kulturminner som har potensial som møtested med ulike tjenester og kulturaktiviteter.
- Utvikle en bydelspark i hver bydel som kan gi attraktive møtesteder i det grønne og være arena for både organiserte og uorganiserte aktiviteter.

4.1 Kriterier for valg av tiltak:

For prioritering av tiltak innenfor programområdet vil det bli lagt vekt på følgende hensyn:

- Se tiltak i sammenheng i geografiske områder og mot andre programområder og levekår
- Tiltak som er forankret i andre planer eller etter behovsprøving
- Tiltak som kan gjennomføres på kort sikt – driftsvirkninger er avklart
- Tiltak som kan bidra til å styrke det biologiske mangfoldet
- Tiltak som har god tilgjengelighet og kan gi universell utforming
- Geografisk fordeling som i størst mulig grad tilgodeser hele dalen

Gjennomføring av større fysiske prosjekter inndeles i flere faser i tidsperioden 2010-2013. Basert på en idéfase og/eller mulighetsstudie videreføres prosjektene med en forprosjektfase for å avdekke utfordringer, finne løsninger og gi et kostnadsoverslag. Deretter følger faser med detaljprosjektering og bygging.



Mindre prosjekter kan gjennomføres med færre faser og kortere tidsperspektiv. Konkretisering av tiltak vil fremgå av de årlige tiltakslistene og vil være avhengig av tildelte budsjetter.

5 TEMATISK INNSATSOMRÅDE

For å nå målene for Programområde 2 ble det i perioden 2007–2009 valgt ut fire tematiske innsatsområder. Disse områdene videreføres i perioden 2010–2013 og er direkte knyttet opp til delmålene. De tematiske innsatsområdene er forankret i Oslo kommunes overordnede planer, der følgende ligger til grunn for arbeidet i Programområde 2:

Kommuneplan 2008 ble vedtatt av Oslo bystyre 11.06.2008 og er et strategisk styringsdokument med overordnede føringer for byutviklingen. Etter at ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2009 ble det krav om juridisk bindende arealdel til kommuneplanen. Det arbeides nå med ny kommuneplan for Oslo, Kommuneplan 2013, som i tillegg til strategisk del vil inneholde juridisk bindende arealkart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Utviklingen i Groruddalen antas å spille en sentral rolle i den nye kommuneplanen.

Helhetlig utviklingsplan - Strategier for et bedre miljø i Groruddalen mot 2030 ble vedtatt 21. juni 2006. I vedtaket inngår det to strategier rettet mot Programområde 2: «styrking av den blågrønne strukturen og styrking av kulturminnevernet og kulturaktivitetstilbud.» I planen for Groruddalen legges blant annet følgende dokumenter til grunn for videre arbeid med å videreutvikle den blågrønne strukturen og bevare og bruke kulturminnene:

- Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen og Alna idérapport «En vandring med vann»
- «Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer», «Groruddalen Kulturminneatlas» og «Strateginotatet Kulturminner i Groruddalen» foreslår bevaring av 30 prioriterte kulturmiljøer.

Kommunedelplan for torg og møteplasser, vedtatt i Bystyret 22.04.2009, tilrettelegger for å etablere nye og videreutvikle eksisterende møteplasser, både bymessige plasser og møtesteder i grønnstrukturen. Planen fastlegger videre bestemmelser i forhold til kvalitet på torg og møteplasser.

Forslag til Kommunedelplan for Alna miljøpark legger rammer for byutvikling langs Alna/Fossumbekken og Tokerudbekken. Planen følger opp kommuneplanene for 2004 og 2008, hvor målet er at Alna skal gjenåpnes og miljøoppgraderes i hele sin strekning innen 2020.

Forslag til Grøntplan for Oslo, Kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone.

Generelt søker planen å sikre bevaring og videreutvikling av den blågrønne strukturen i Oslo. I planen foreslås gjenåpning av 10 prioriterte sidebekker til Alna, og fullføring av det overordnede turveinettet i Groruddalen. Forslag til bestemmelser og retningslinjer vil, dersom de vedtas, ha stor betydning for utformingen av for eksempel turdrag. Det er i plankartet vist til prinsipplasseringer for nye parker på 1 og/eller 5 dekar, fremtidig prinsipptrasé for elv/bekk og områder med behov for parker i ulike størrelser.

Verneplan for Akergårdene, vedtatt 26.08.2009, inneholder en registrering og prioritering av gårdsanleggene i Groruddalen. Planen er ikke juridisk bindende etter plan- og bygningsloven, men er et forslag til kommunens strategi arbeid med prioritering og bevaring av Akergårdene.

Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2009–2012 ble vedtatt i bystyret 4. mars 2009. I fortsettelsen brukes analyser gjort i denne planen som utgangspunkt for å beskrive status for idrettsaktivitet og idrettsanlegg i de fire groruddalsbydelene Bjerke, Alna, Grorud og Stovner.



Rasteplass i Grorudparken.

Foto Roy Tjomsland.

Forslag til plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013–2016 lå ute til offentlig ettersyn våren 2012 og forventes vedtatt tidlig vinter 2013. Planen er en revidering og oppdatering av forrige plan. Planens handlingsprogram viser den retningen man ser for seg at utviklingen av anlegg og områder til idrett og friluftsliv skal ta innenfor 4-årsperioden, deriblant flere anlegg og områder i Groruddalen.

Øvrig pågående plan- og utviklingsarbeid:

Områderegeringsplan på Furuset som bl.a. inkluderer bekkeåpning og parksystem; Prinsippplan for offentlige rom på Breivoll som bl.a. detaljerer Alna og sammenbindende grøntstrukturer; Mulighetsstudie Grorud stasjonsområde som viser løsninger for gjenåpning av Alna; Mulighetsstudie byutvikling i Rommenområdet bl.a. med utgangspunkt i Tokerudbekken og grøntområdene.

5.1 Delmål 1: Det skal være en kvalitetsheving for friluftsliv, naturmangfold og kulturminner langs Alna og mest mulig av elva og sidebekkene skal åpnes fra Marka til fjorden

Målet om Alna som en sammenhengende åpen elv fra Marka til fjorden står sentralt i flere overordnede planer, blant annet i gjeldende kommuneplan. Av Alnas løp på 17 km fra Marka til fjorden ligger ca. 4 km i rør.

Det langsiktige målet er å åpne hele Alna og etablere et turdrag langs dalbunnen til sentrum. Alna renner gjennom områder som trenger fysisk opprusting og forbedring. For å nå visjonen og målet for Alna må gjenåpning være et premiss for bygging av infrastruktur og byutvikling i disse områdene, og en integrert del av planleggingen. Statlige etater er hovedaktører og må samarbeide nært med Oslo kommune om gjenåpning av Alna. Vann- og avløpsetaten gjennomfører nå et omfattende program for å redusere forurensningen av Alna ved å fornye avløpsnettets langs vassdraget. Målet er at oppryddingstiltakene er gjennomført i løpet av perioden. Prosjekter for åpning av Alna vil ved utvikling, planlegging og bygging samordnes med tiltak innenfor de andre delmålene i de aktuelle områdene.

Tiltak for perioden 2010–2013:

Arbeidet med åpning av Alna og sidebekker videreføres. Følgende typer tiltak vil bli prioritert:

- Tiltak for å redusere forurensning av Alna
- Gjennomføre/forsterke Alna som blågrønn struktur på langs av dalen
- Tiltak som bidrar til gjenåpning av Alna
- Gjennomføre enkeltåpninger av sidebekker

Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak som faller under delmål 1. Tabellen er ikke utfyllende for hele planperioden.

1. Utredning/planlegging/prosjektering			
Navn på tiltak	BYDEL	ANSVAR	OM TILTAKET
Grorud stasjonsområde	Grorud/Alna	PBE/VAV	Tiltaket videreføres fra HP 2007–2010. Arbeide videre med plangrep i henhold til nye innspill og behov bl.a. nye jernbanespor. Mulighetsstudie ferdigstilt desember 2011
Breivoll	Alna	PBE/VAV	Alnas kryssing under E6 og gjenåpning av Trosterudbekken ²
Furuset	Alna	PBE/VAV/ BYM	Gjenåpning av Gransbekken, Bakåsbekken og Senterbekken på Furuset. Sees i sammenheng med senterutvikling og Verdensparken.
Fossumbekken over Rommen-sletta	Stovner	VAV BYM/ EBY	Videreutvikle plan for gjenåpning basert på forslagene i Kdp Alna miljøpark og Alna-visjonen utsettes til handlingsprogram for 2013–2016
Veitvet-Trosterud	Bjerke/Alna	VAV	Videreutvikle planen for tverraksen basert på Kdp Alna miljøpark og Mulighetsstudien utsettes til handlingsprogram for 2013–2016. Inngår i BYMs prosjekt.
Lindebergbekken	Alna	BYM/VAV	Sammenhengende åpent bekkeløp fra Marka til Alna, langs prioritert tverrakse. Jf. tiltak under delmål 2
2. Fysisk gjennomføringstiltak			
Grorudparken	Grorud	VAV/BYM	Ferdigstilling av utbygging (2010/2014) av området langs Alna, fra Leirfossen til Grorud senter/Ammerud amfi. Sanering av utslipp, opprustning av gangveier med bl.a. belysning, og rehabilitering av Groruddammen.
Bjerkedalen/Hovinbekken	Bjerke	Bjerke/ VAV/BYM	Gjennomføring av bydelsparken med bekk, badedam, turvei og parkstier, møteplass, og vegetasjon. Evt. gjenstående tiltak overføres til handlingsprogram 2013–2016

Andre tiltak av betydning for programområdet:

Tiltaket er et eksempel på større tiltak som har stor innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imidlertid ikke definert som en del av satsingen.

- Fornyng av avløpsnett for å redusere forurensning av Alna

5.2 Delmål 2: Grønnstrukturen og turveier skal bli sammenhengende på tvers og langs av dalen. Det skal utvikles attraktive møteplasser i tilknytning til grønnstruktur og boligområder

Alna er ryggraden i Groruddalens grønnstruktur, og det bør satses bevisst på nøkkelprosjekter langs denne elva. Prosjektene bør omfatte elveåpninger, turveier, oppholdssoner og vern av biologisk mangfold, stedegen vegetasjon og viktige naturtyper og kulturlandskap. Videre bør det oppnås en bedre forbindelse mellom parkene i dalen, både de som ligger i hovedstrukturen langs vassdraget og de som ligger mer spredt i dalsidene, gjennom et styrket turveinett og flere grønne drag på tvers av dalen.

Kvalitetsheving av en rekke parkanlegg er nødvendig og kan lede til mer attraktive parker for brukerne. Grønnstrukturen skal romme et mangfold av områder fra de naturpregede til kulturlandskapet og de strengt kultiverte og foredlede områdene.

Turveiene skal fungere som grønne korridorer i landskapet med både gangtraseene og omgivelsene som viktige deler av turveiene. Utfordringer man står overfor, er særlig kryssing av transportkorridorene og behov for eiendomsserv. Det er registrert mange verdifulle naturtyper for flora og fauna i Groruddalen. En artsrik og variert vegetasjon kan ha stor opplevelsesverdi for friluftsliv og rekreasjon. Gjennom bedre tilrettelegging og kanalisering av ferdsel kan områdenes status heves og bruken økes. Enkelte områder som er sårbare for bruk, bør imidlertid skånes for tilrettelegging.

I all planlegging som berører verdifulle områder, bør økologiske planprinsipper legges til grunn. Noen områder krever også særskilt skjøtsel for å ivareta naturverdiene. Bekjempelse av uønskede introduserte arter er også viktig. Arbeidet med å utvikle den blå-grønne strukturen langs Alna og innsatsen for å bedre tverrforbindelser mellom Østmarka og Lillomarka skal fortsette. I tillegg skal de fire bydelsparkene prioriteres og ferdigstilles.

Tiltak for perioden 2010–2013:

Følgende type tiltak vil bli prioritert:

- Fullføre turveinettet
- Videreføre og styrke tverrforbindelse på tvers av dalen
- Gjennomføre/supplere forbindelsen Grorud–Ellingsrud
- Etablere tverrforbindelser mellom Rødtvet og Lindeberg

- Planlegge og utvikle bydelsparker i samarbeid med lokale krefter og interessegrupper

Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak som faller under delmål 2. Tabellen er ikke utfyllende for hele planperioden.

1. Utredning/planlegging/prosjektering			
NAV N PÅ TILTAK	BYDEL	ANSVAR	OM TILTAKET
Mulighetsstudier av tverrforbindelser mellom Østmarka og Lillomarka	Alna Stovner Bjerke	BYM	Forsterke og supplere grønne tverrforbindelser på tvers av dalen - Lindeberg–Rødtvet - Årvoll–Risløkka–Alnabru–Tveita
Utredninger for kryssing av barrierer	Alle	BYM	Øke tilgjengeligheten til Marka og binde sammen turveinettet. Turvei D15, kryssing av Trondheimsveien ved Bredtvet Turvei D16 – kryssing av Ytre Ringvei Turvei D10 Alnabru/Breivoll
Utredning og prosjektering av parker og møtesteder	Alle	BYM	Utvikling av bydelsparker/ aktivitetsparker: Bjerkedalen park, Grorudparken, Linjeparken, Verdensparken, Lindebergparken, Tveitaparken, Rommensletta, og Byggeren
Linjeparken	Stovner	BYM	Etablering av bydelspark – regulering/prosjektering
Grønn tverrforbindelse i Grorud-dalen Lindeberg–Rødtvet	Bjerke Grorud Alna	BYM	Oppfølging av mulighetsstudie: Turvei D15 Bredtvet Turvei D15 langs Veitvetbekken Turvei D15, Alnaparken–E6 Turvei D15 langs Lindebergbekken og Lindebergparken
Utredninger for etablering av nye turveier	Alle	BYM	Supplere turveinettet. Eksempler på strekninger Turvei D6 Statsråd Mathisens vei–Bjerkedalen Turvei D8 Gårdsveien–Trondheimsveien Turvei D8 Kristian Bogneruds vei–Vesletjern
Erverv av grunn eller bruksrettsavtaler	Alle	BYM	Diverse turveistrekninger og friområder
2. Fysisk gjennomføringstiltak			
Youngslunden, Tveitaparken, Bygger'n Rommensletta skulpturpark m.fl.	Alle	BYM	Oppgradering av eksisterende parker/ etablering av nye parker
Verdensparken	Alle	BYM	Etablering av bydelspark, gjennomføring etappe 1 & 2 med møteplasser, bekkeåpning parkouranlegg og «verdensplassen»
Bjerkedalen park	Bjerke	Bjerke/BYM	Etablering av bydelspark, gjennomføring av etappe 1 & 2 med bekk/gangvei og opparbeidelse av parken jf. tiltak under delmål 1.
Grorudparken	Grorud	VAV/BYM	Etablering av bydelspark med møteplasser, turveier belysning og bruer. Jf. tiltak under delmål 1.
Turveistrekninger D6, D8, D10, D15, D16	Alle	BYM	Etablering/bygging av nye turveistrekninger på langs og tvers av dalen.
Rehabilitering av eksisterende turveier	Alle	BYM	Turvei D10 langs Smalvollveien
Bekjempelse av introduserte/ uønskete arter	Alle	BYM	Gjennomføres i alle prosjekter hvor dette er aktuelt.
Treplantning	Alle	BYM	Treplantning i strategiske områder

Andre tiltak av betydning for programområdet:

Tiltakene er eksempel på større tiltak som har stor innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imidlertid ikke definert som en del av satsingen.

- Furuset senter, torgplass – Plan for utbygging av senteret og områdeplan for senterområdet.

5.3 Delmål 3: Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres eller vernes og tas aktivt i bruk, blant annet som møtesteder

Groruddalen har bevart et bredt spekter av kulturminner fra ulike tidsperioder. Forhistoriske funn, gamle ferdselsårer, gårder og husmannsplasser utgjør de eldste strukturene i dalen. Groruddalen slik den framstår i dag, er sterkt preget av de store utbyggingene i tiårene etter siste verdenskrig. Den åpne blokkbebyggelsen og drabantbyene ble skapt med utgangspunkt i etterkrigstidens planleggingsideologi, en periode preget av store visjoner, framtidsoptimisme og ny teknologi. Utbyggingene i Groruddalen dannet forbilde for resten av landet, og kan dermed karakteriseres som en viktig del av Norges bolig- og kulturhistorie.

Dalens kulturminner bør vedlikeholdes, pleies, synliggjøres og formidles, og de bør være premissgivende for den videre utviklingen av Groruddalen. De registreringene som foreligger, omfatter dagens kjente kulturminner, og det vil være behov for oppfølgende arbeider.

Dette gjelder særlig kulturminner fra det 20. århundre, som bolig- og drabantbybebyggelse. Kulturminner og -miljøer bidrar til å gi dalen historisk dybde og kommende generasjoner kunnskap og opplevelser. Å formidle kunnskap om nærmiljøets

historie til dagens beboere vil være en viktig oppgave. Dette kan bidra til å styrke den lokale identiteten og tilhørigheten samt å øke historieforståelsen. Tiltak knyttet til formidling kan også være med på å heve omdømme og status. Noen av dalens kulturminner er i dag møteplasser for ulike former for aktiviteter, og bidrar til å skape et godt oppvekst- og bomiljø. Til nå er det spesielt Akergårdene som er benyttet til slike formål. Akergårdene utgjør en prioritert kulturminnetype knyttet til dalens lange og viktige jordbrukshistorie. For opplevelsen av Akergårdene er beliggenheten av stor betydning. Det er viktig at tidligere kulturlandskap som beitemark, åker, eng og hager bevares og skjøttes.

Gårdene skal videreutvikles som viktige møteplasser i bydelene med ulike former for kulturaktiviteter. Anleggene skal være åpne for publikum, også for befolkningen utenfor bydelens grenser. De ulike historiske gårdsanleggene bør gis driftskonsepter som utfyller hverandre heller enn å konkurrere om samme publikum. Det finnes et potensial til å bruke også andre typer kulturminner til møteplasser, herunder også objekter fra etterkrigstiden.

Tiltak for perioden 2010–2013:

Følgende type tiltak vil bli prioritert:

- Videreutvikle Akergårdene i hver bydel som ble valgt ut i forrige periode
- Sikre/synliggjøre minst 5 kulturminner i hver bydel
- Tiltak som bidrar med økt forståelse av dalens kulturminne/-miljø

Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak som faller under delmål 5. Tabellen er ikke utfyllende for hele planperioden.

1. Utredning/planlegging/prosjektering			
NAVN PÅ TILTAK	BYDEL	ANSVAR	OM TILTAKET
Arveset gård, mulighetsstudie	Alna	BYA	Utvikle et brukskonsept som ivaretar alle bygningene på tunet
Grorud samfunnshus, mulighetsstudie	Grorud	Grorud	Utarbeide mulighetsstudie.
Gamle Rommen skole, mulighetsstudie	Stovner	BYA	Utvikle et bærekraftig brukskonsept som ivaretar kulturminneverdiene og gjør anlegget mer tilgjengelig utsettes til handlingsprogram for 2013–2016.
Kulturminneatlas og Veiviser på nett.	Hele dalen	BYA	Lage en nettutgave av Kulturminneatlas og den kulturhistoriske Veiviseren. I prosjektet ligger også samarbeid med videregående skoler i Groruddalen.
Mulighetsstudie Øvre Isdam	Bjerke	Bjerke	Sikre Isdammen som kulturminne og møteplass
Linderud gård – videreutvikling/prosjektering	Bjerke	Bjerke	Gården skal gjøres tilgjengelig som kulturell møteplass
Prosjektering for rehabilitering av Nordre Lindeberg gård	Alna	KUL	Rehabiliterer våningshus, tilrettelegge adkomst og parkering
Årvoll gård	Bjerke	Bjerke	Det er utarbeidet en sikringsplan for driftsbygninger og våningshus. Nye prosjekter/tiltak vil bli utarbeidet i perioden
Utarbeide kulturminnegrunnlag for prioriterte kulturmiljø	Hele dalen	BYA	Utarbeide kulturminnegrunnlag for viktige kulturmiljøer i dalen
Sikre og synliggjøre 5 kulturminner i hver bydel.	Hele dalen	BYA	Løfte fram og formidle/sikre kulturminner/miljøer gjennom medvirkning fra bydeler og andre etater
DIVE-analyse, Linderud, Vollebakk og Økernbråten	Bjerke	BYA	I samarbeid med bydel Bjerke, PBE, Riksantikvaren, Linderud gård, andre kommunale etater, beboere og andre aktører gjennomføre en DIVE-analyse (kulturhistorisk stedsanalyse).
2. Fysisk gjennomføringstiltak			
Nordtvet gård	Grorud	Grorud	Videreutvikling av gårdsanlegget. Rehabilitering
Bånkall gård	Grorud	KUL	Videreutvikling av gårdsanlegget. Rehabilitering
Grorudparken	Grorud	VAV	Skilting, skjøtsel av Kalbakken bru og restaurering av hageanlegget på Nedre Grorud gård
Nordre Lindeberg gård	Alna	KUL	Rehabilitering og videreutvikling
Bruk og vern av Grorudveien 3 og 5	Grorud	KUL	Rehabilitering av bygningene
Øvre Isdam	Bjerke	Bjerke	Ferdigstillelse av bygninger og uteområde.
Årvoll gård	Bjerke	Bjerke	Ferdigstillelse av kultursal
Grorud samfunnshus	Grorud	Grorud	Gjennomføre mulighetsstudie
Kulturminner i Grorudparken	Grorud	BYA mfl	Sikring og utbedring av Kalbakken bru, restaurering av prestegårdshagen på Nedre Grorud gård. Skilting av kulturminner i parken
Akergårder – synliggjøring.	Hele dalen	BYA	Skilting av 5 gårder

Andre tiltak av betydning for programområdet:

Tiltakene er eksempel på større tiltak som har stor innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imidlertid ikke definert som en del av satsingen.

- Oppfølging av Bevaring av etterkrigstidens kulturminner
- Oppfølging av Bevaring av bolighistoriske kulturminner – hytte- og småhusbebyggelse
- Juridisk sikring av prioriterte gårdsanlegg og husmannsplasser i dalen (Verneplan for Akergårdene)
- Tveten gård – kjøp og rehabilitering
- Lindeberg gård – kjøp av våningshus m.m.
- Kulturhistorisk kartlegging av dalbunnen langs Alna og Tokerudbekken med vekt på kulturlandskap, eldre veifar, gårdsanlegg, industrianlegg og topografi.

5.4 Delmål 4: Tilrettelegging for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Det er mange som driver fysisk aktivitet i Groruddalen, både som organisert aktivitet gjennom idrettslagene og som egenorganisert aktivitet. 16 prosent av Oslos idrettslagsmedlemmer er tilknyttet lag som holder til i Groruddalen med aktiviteter som drives både i og utenfor idrettsanleggene. Gode muligheter til å drive fysisk aktivitet i grønne omgivelser er viktig i denne sammenhengen, og tilgangen til idrettsanlegg, turveier, parker og Marka må være enkel. Idrett og fysisk aktivitet kan knyttes til folkehelse på minst tre måter. Den ene måten er den fysiske effekten slik aktivitet er dokumentert å ha, med forebygging og begrensnings av sykdom og helseplager. Videre er det påvist at fysisk aktivitet også bidrar positivt til folks mentale helse, som avbrekk i en hektisk hverdag eller mer direkte i forbindelse med psykiske plager. Ved siden av de fysiske og mentale gevinstene man oppnår gjennom fysisk aktivitet, fungerer dette også sosialt integrerende på flere måter. I Oslo, som har en rekke storbyutfordringer, er

det behov for å se på aktivitet som en arena for sosial læring, integrering og kommunikasjon på tvers av sosiale og etniske/kulturelle skillelinjer.

Tiltakene som programområdet ønsker å videreføre i neste periode, er enkeltprosjekter som del av et idrettsanlegg eller en idrettspark. Idrettsanleggene er som regel en del av et større friområde som inngår i grønnstrukturen. I tillegg til planer for hvert enkelt tiltak er det derfor også ønskelig å få utarbeidet en rehabiliteringsplan for hvert idrettsanlegg og hver idrettspark, samt en oversikt som viser sammenhengen mellom disse.

Tiltak for perioden 2010–2013:

Følgende type tiltak vil bli prioritert:

- Tiltak for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet
- Supplere Groruddalens fysiske infrastruktur med tanke på idrett og friluftsliv
- Bidra til informasjon og tiltak som stimulerer til økt fysisk aktivitet, spesielt tiltak som kan
- utløse aktivitet
- Bygging av flere idrettsanlegg



Tiltakene under gir en oversikt over prioriterte tiltak som faller under delmål 3. Tabellen er ikke utfyllende for hele planperioden.

1. Utredning/planlegging/prosjektering			
NAVN PÅ TILTAK	BYDEL	ANSVAR	OM TILTAKET
Kunstisbane v./Grorud idrettsanlegg	Grorud	BYM	Reguleringsplanen for idrettsparken som bl.a. omfatter kunstisbane og flerbruksplan er vedtatt. Det må utarbeides KVV og deretter forprosjekt med tanke på kvalitetssikring (KS2). Deretter kan det fastsettes en kostnadsramme for prosjektet.
Kunstisbane v./Rockefabrikken	Stovner	BYM	Forprosjekt er utarbeidet. Kvalitetssikring (KS2) gjenstår. Deretter kan det fastsettes en kostnadsramme for prosjektet.
Kunstisbane v./Lørenhallen	Bjerke	BYM	Det må utarbeides KVV og deretter forprosjekt med tanke på kvalitetssikring (KS2). Deretter kan det fastsettes en kostnadsramme for prosjektet.
2. Fysisk gjennomføringstiltak			
Kunstisbane v./Furuset Forum	Alna	BYM	Ferdigstilt i 2011
Haugerud idrettsanlegg	Alna	BAL	Ny tennisbane og streetbasketbane

Andre tiltak av betydning for programområdet:


Tiltakene er eksempel på større tiltak som har stor innvirkning på Programområde 2. Tiltaket er imidlertid ikke definert (ikke finansiert?) som en del av satsingen.

- Planforslag Lillomarka idrettspark, reguleringsplan ferdigstilles 2012–2013
- Skisseprosjekt forlengelse av Jerikobakken, ferdigstilles i perioden 2012–2013
- Rehabiliteringsplan for Rommensletta med blant annet planlegging av klubbhus v./cricketbane. Uavklart når rehabilitering kan påbegynnes, må ses i sammenheng med planlegging av klubbhus og hvor cricketbanen på Rommensletta og andre anlegg skal ligge i fremtiden.
- Plan for idrettsgarderobe v./Bjøråsen kunstgressbane, uavklart når dette kan påbegynnes
- Planlegging av flerbrukshall v./Årvoll: Arbeidet med KVV planlegges påbegynt i 2013 for godkjenning i 2014. Forprosjekt med styringsdokument planlegges påbegynt i 2014 med tanke på ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2015. Antatt byggestart 2016.
- Planlegging av flerbrukshall v./Østre Aker vei 100 på Risløkka (UBF) – prosess igangsatt (OPS)
- Planlegging av flerbrukshall v./Grorud idrettspark: Arbeidet med sentral KVV ble påbegynt i 2012 og planlegges sendt til godkjenning i 2013. Forprosjekt med styringsdokument planlegges påbegynt i 2013 med tanke på ekstern kvalitetssikring (KS2) i 2014. Antatt byggestart i 2015.
- Etablering av kunstgressbaner på Grorud idrettspark og på Høybråten ferdigstilles i perioden 2010–2013
- Kunstgressbanen på Stubberudmyra planlegges skiftet i 2013.
- Bygging av klubbhus v./Brynbanen og idrettslekeplass v./Høybråten tennisbane, ferdigstilt 2011
- Rehabilitering av Romsås bad, byggetrinn 1 ble ferdigstilt 2010.

DEL 3

FORDELING AV MIDLER

Goruddammen og
«Katedralen» i Gorudparken.
Foto Synnøve Riise Bøgeberg.

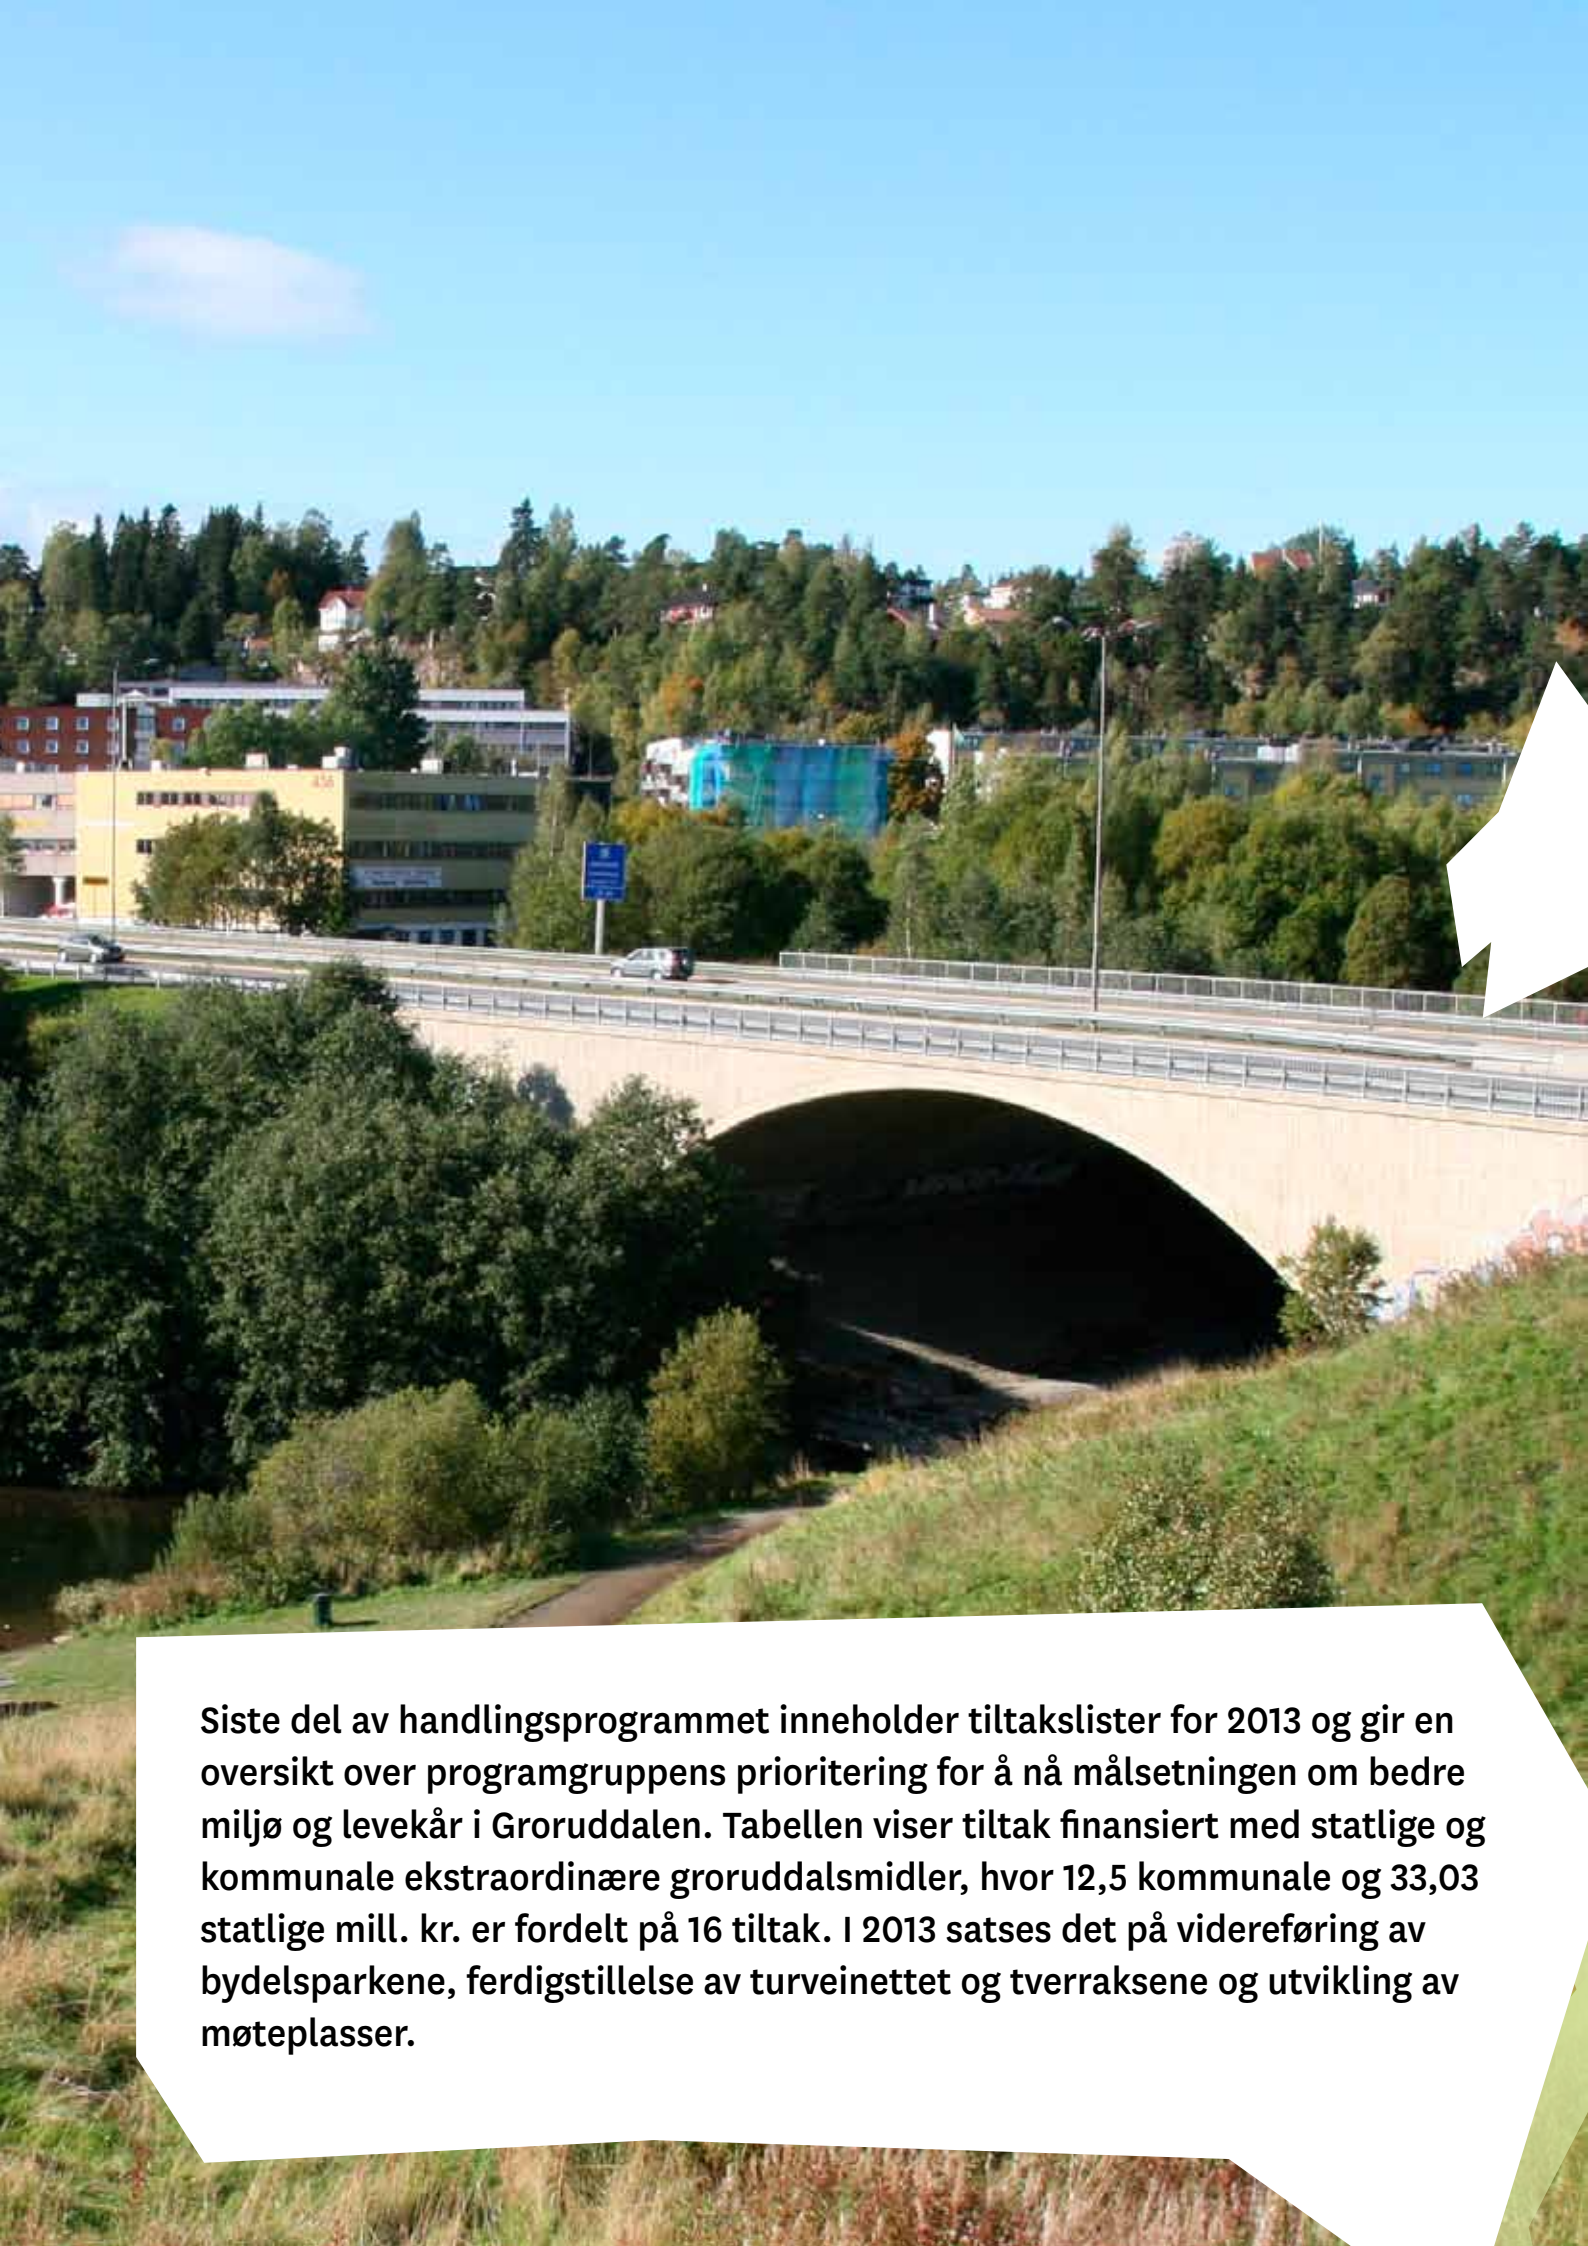

Siste del av handlingsprogrammet inneholder tiltakslister for 2013 og gir en oversikt over programgruppens prioritering for å nå målsetningen om bedre miljø og levekår i Groruddalen. Tabellen viser tiltak finansiert med statlige og kommunale ekstraordinære groruddalsmidler, hvor 12,5 kommunale og 33,03 statlige mill. kr. er fordelt på 16 tiltak. I 2013 satses det på videreføring av bydelsparkene, ferdigstillelse av turveinettet og tverraksene og utvikling av møteplasser.

Tiltakslisten er utarbeidet av programgruppen og lagt frem for Samarbeidsutvalget for Groruddalen. Foreslåtte prioriteringer ble vedtatt av byrådet i 2013. Av de 19 tiltakene som er blitt tildelt midler i 2013, er 9 av tiltakene videreført og 10 er nye.

I byrådssak 1030/13 er det besluttet en ramme på

12,5 mill. kr. fra de kommunale groruddalsmidlene, i tillegg til **33,03 mill. kr.** fra Miljøverndepartementet. Ut fra denne økonomiske rammen på **45,53 mill. kr.** er følgende prosjekter finansiert gjennom Groruddalssatsingen i 2013 utover de ordinære budsjettene.

1.1 Tiltak finansiert med ekstraordinære midler

Tabell 5

NR	PROSJEKTER	BYDEL	ANSVAR	STATLIGE MIDLER MILL. KR.	KOMMUNALE MIDLER MILL. KR.	PROSESS	DELMÅL SOM OPPFYLLES
1	Bjerkedalen park – avsluttende etappe – gjennomføring	BBJ	BYM/BBJ	11,096	0	T	1,2 & 3
2	Grorudparken – 2.etappe – gjennomføring	BGR	VAV	4,5	4	T	1,2 & 3
3	Aktivitetsakse/idrettsanlegg – Grorud park – Planlegging	BGR	VAV	0,5	0	P	2 & 3
4	Isdammen på Årvoll – gjennomføring	BBJ	BBJ	0,71	0	T	2,3 & 5
5	Verdensparken – 2. etappe – gjennomføring	BAL	BYM	6,4	6	T	1,2, & 3
6	Superrusken Groruddalen	Hele dalen	BYM	2,4	0	T	2,3 & 5
7	Tyskerbrakker på Grorud – mulighetsstudie	BGR	BYA	0	0,15	P	5
8	Rehabilitering Bånkall gård – KVV tilstandsrapport/ bruksmuligheter	BGR	KUL	0	0,5	P	5
9	Dr. Londons park behovsanalyse/KVV	Hele dalen	BGR	0	0,5	P	2 & 3
10	Nordtvet ridehall – møteplass – Behovsanalyse/KVV	BGR	BGR	0,5	0	P	2 & 3
11	Tveten gård – KVV av bruksmuligheter	BAL	BAL/KUL	0,4	0,4	P	2 & 5
12	Turvei D10 Bryn–Smalvollen Planlegging	BAL	BYM	1	0	P	2 & 3
13	Haugerudparken – behovsanalyse/KVV	BAL	BAL	0	0,3	P	2
14	Refstadveien – kulvert – planlegging/forenklet KVV	BBJ	BYM	0	0,6	P	2 & 3
15	Gjenåpning av Alna v./Ammerudveien – KVV/prosjektering	BGR	BYM	3,5	0	P	1 & 2
16	Hageanlegg Grorudveien 3 og 5 – gjennomføring	BGR	KUL	0,5	0	T	2 & 5
17	Gamle Rommen skole – tilstandsrapport	BSR	BYA	0,15	0,05	P	5
18	Mobiliseringstiltak fysisk aktivitet	Hele dalen		0,344	0	T	2 & 3
19	Skilting og synliggjøring av gjennomførte tiltak	Hele dalen		1,03			
				33,03	12,5		

2 TILTAK FINANSIERT MED ORDINÆRE MIDLER

Tabellen viser en oversikt over tiltak som er definert inn i satsingen finansiert over ordinært kommunalt budsjett i 2013. Totalt vil det bli jobbet med 9 tiltak i Groruddalen.

Tabell 6

NR	PROSJEKTER	BYDEL	ANSVARLIG	STATLIGE MIDLER	KOMMUNALE MIDLER	PLANLEGGING	GJENNOMFØRING
1	Grorud kunstgressbane	Grorud	BYM	2,5	7,1		x
2	Høybråten kunstgressbane						
3	Stubberudmyra kunstgressbane, rehabilitering						
4	Utredning idrettshall Grorud og Årvoll	Grorud	BYM		1,5	x	
5	Høybråten kunstgressbaner	Stovner	BYM	-	-		X
6	Fornyng av avløpsnett	Hele dalen	VAV	-	29	x	x
7	Utarbeide kulturminnegrunnlag for to prioriterte kulturmiljø i Groruddalen (prioritert i HUG-en)	Hele dalen	BYA	-	-		x
8	Starte arbeidet med å sikre og synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel (punkt i Handlingsprogrammet for 2010–2013)	Hele dalen	BYA	-	-		x
9	Registrering av småhusområder i Groruddalen, og påfølgende oppføring på gule lister	Hele dalen	BYA	-	-		x

Tiltak som skal gjennomføres i 2013:

1. Linjeparken, forprosjekt/regulering
2. Ytre ringvei-Tvetenveien, turvei D16, gjennomføring
3. Bånkall gård, ny adkomst og sikring
4. Bakås skanser, skjøtselsplan, gjennomføring
5. Nordre Lindeberg gård, rehabilitering
6. Bjerkedalen bydelspark, gjennomføring av 1. etappe
7. Fjellhus allé, restaurering
8. Grorud samfunnshus, mulighetsstudie
9. Årvoll isdam, gjennomføring
10. Turvei D15 langs Lindebergbekken, prosjektering
11. Statsråd Mathiesens vei-Lunden, turvei D6
12. Byggeren parkanlegg, gjennomføring
13. Grorudparken, gjennomføring
14. Bydelsrusken Groruddalen (ikke kartfestet)
15. Steinbruddet kulturhus/London park – KVV
16. Verdensparken, gjennomføring av 1. etappe
17. Turvei D10 gjennom Brynmrådet, prosjektering
18. Turvei D15, grønn tverrakse, prosjektering (ikke kartfestet)
19. Rommensletta skulpturpark
20. Stig skole
21. Vestli skole
22. Turvei D16, Smalvollveien-Ytre Ringvei, bygging
23. Skilting av kulturminner i Groruddalen (ikke kartfestet)
24. Fysisk aktivitet i Groruddalen (ikke kartfestet)

25. Aktivitetsakse/idrettsanlegg – Grorud
26. Tyskerbrakke på Grorud – mulighetsstudier
27. Nordtvet ridehall – KVV
28. Tveten gård – bruksmuligheter – KVV
29. Haugerudparken – KVV
30. Refstadveien kulvert – KVV
31. Gjenåpning av Alna/Ammerud – KVV
32. Hageanlegg Grodruveien 3 og 5 – gjennomføring
33. Gamle Rommen skole – tilstandsrapport

Nye tiltak som skal gjennomføres i 2013 med ordinære kommunale midler:


1. Grorud kunstgress
2. Høybråten, kunstgress
3. Stubberudmyra, kunstgress – rehabilitering
4. Utredning idrettshall Grorud
5. Høybråten kunstgressbane
6. Fornyng av avløpsnett (ikke kartfestet)
7. Utarbeide kulturminnegrunnlag for to prioriterte kulturmiljøer i Groruddalen (ikke kartfestet)
8. Starte arbeidet med å synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel (ikke kartfestet)
9. Registrering av småhusområder i Groruddalen (ikke kartfestet)


Tiltak som skal gjennomføres i 2013

1. Linjeparken, prosjektering
2. Turvei D 16, Ytre Ringvei – Tvetenveien, gjennomføring
3. Bånnkall gård, rehabilitering
4. Bakås skanser, skjøtselplan, gjennomføring
5. Nordre Lindeberg gård, rehabilitering
6. Bjerkedalen bydelspark, gjennomføring
7. Fjellhus Allé, restaurering
8. Årvoll isdam, gjennomføring
9. Lindebergparken og turvei D 15 langs Lindebergbekken, prosjektering
10. Statsråd Mathiesens vei–Lunden, turvei D6
11. Byggeren park, gjennomføring
12. Grorudparken, gjennomføring
13. Bydelsrusken Groruddalen (ikke kartfestet)
14. Steinbruddet kulturhus/London park – KVV
15. Verdensparken, gjennomføring
16. Turvei D10, gjennom Brynområdet, prosjektering
17. Turvei D15, grønn tverrakse, prosjektering (ikke kartfestet)
18. Rommensletta skulpturpark, gjennomføring
19. Stig skole
20. Vestli skole
21. Turvei D16, Smalvollveien–Ytre Ringvei, bygging
22. Skilting av kulturminner i Groruddalen (ikke kartfestet)
23. Fysisk aktivitet i Groruddalen (ikke kartfestet)
24. Aktivitetsakse/idrettsanlegg – Grorud
25. Tyskerbrakke Grorud – mulighetsstudie
26. Nordvet ridehall, KVV
27. Tveten gård – bruksmuligheter – KVV
28. Haugerudparken – KVV
29. Refstadveien kulvert – KVV
30. Gjenåpning av Alna/Ammerud
31. Hageanlegg Grorudveien 3 & 5 – gjennomføring
32. Gamle Rommen skole – tilstandsrapport

Tiltak som skal gjennomføres i 2013 med ordinære kommunale midler

1. Grorud kunstgressbane, gjennomføring
2. Idrettshall Grorud, utredning
3. Høybråten kunstgressbaner, gjennomføring
4. Stubberudmyra kunstgress, rehabilitering
5. Fornying av avløpsnett (ikke kartfestet)
6. Utarbeide kulturminnegrnlag for to prioriterte kulturmiljøer i Groruddalen (ikke kartfestet)
7. Starte arbeidet med å synliggjøre minst fem kulturminner i hver bydel (ikke kartfestet)
8. Registrering av småhusområder i Groruddalen (ikke kartfestet)

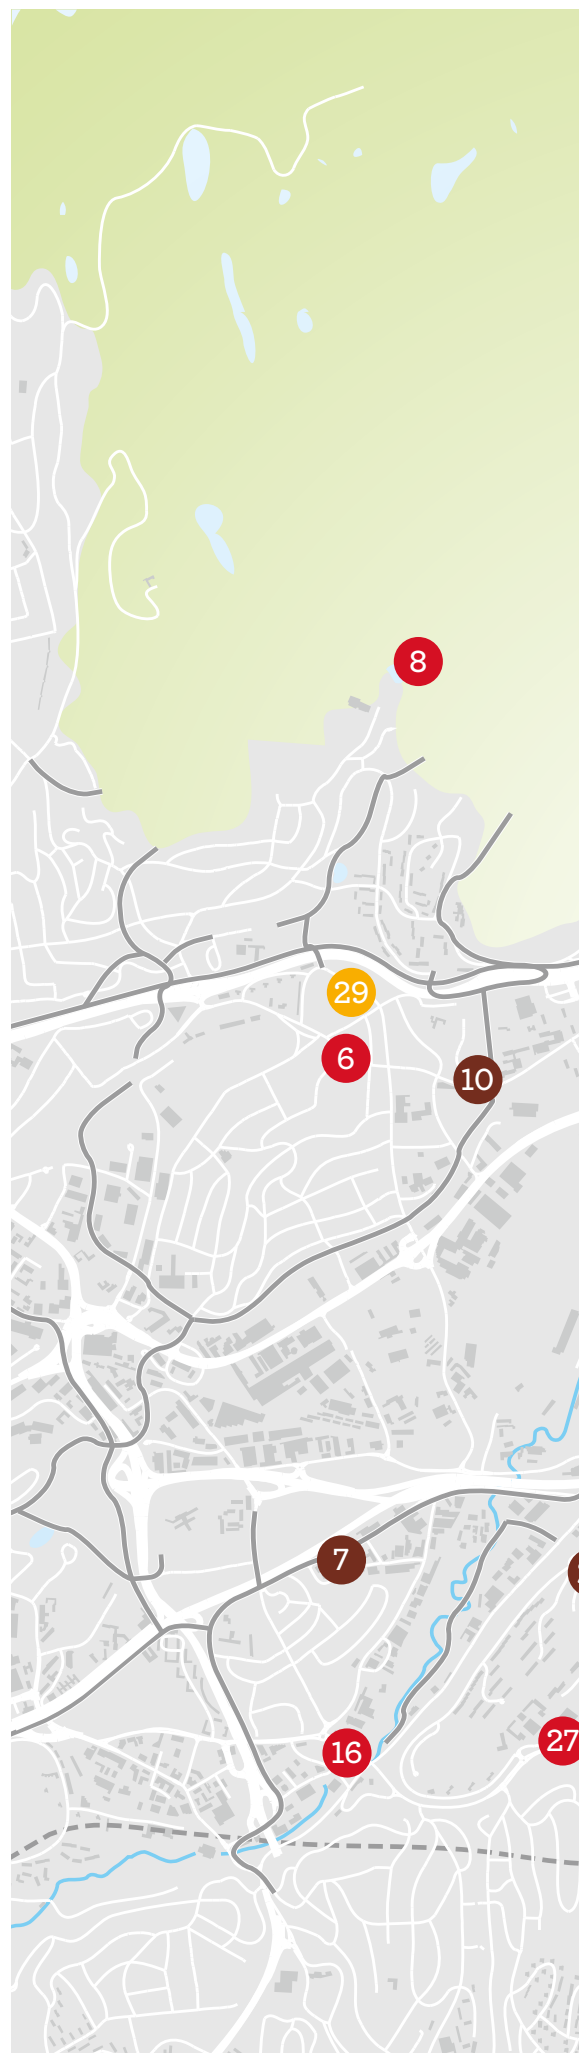

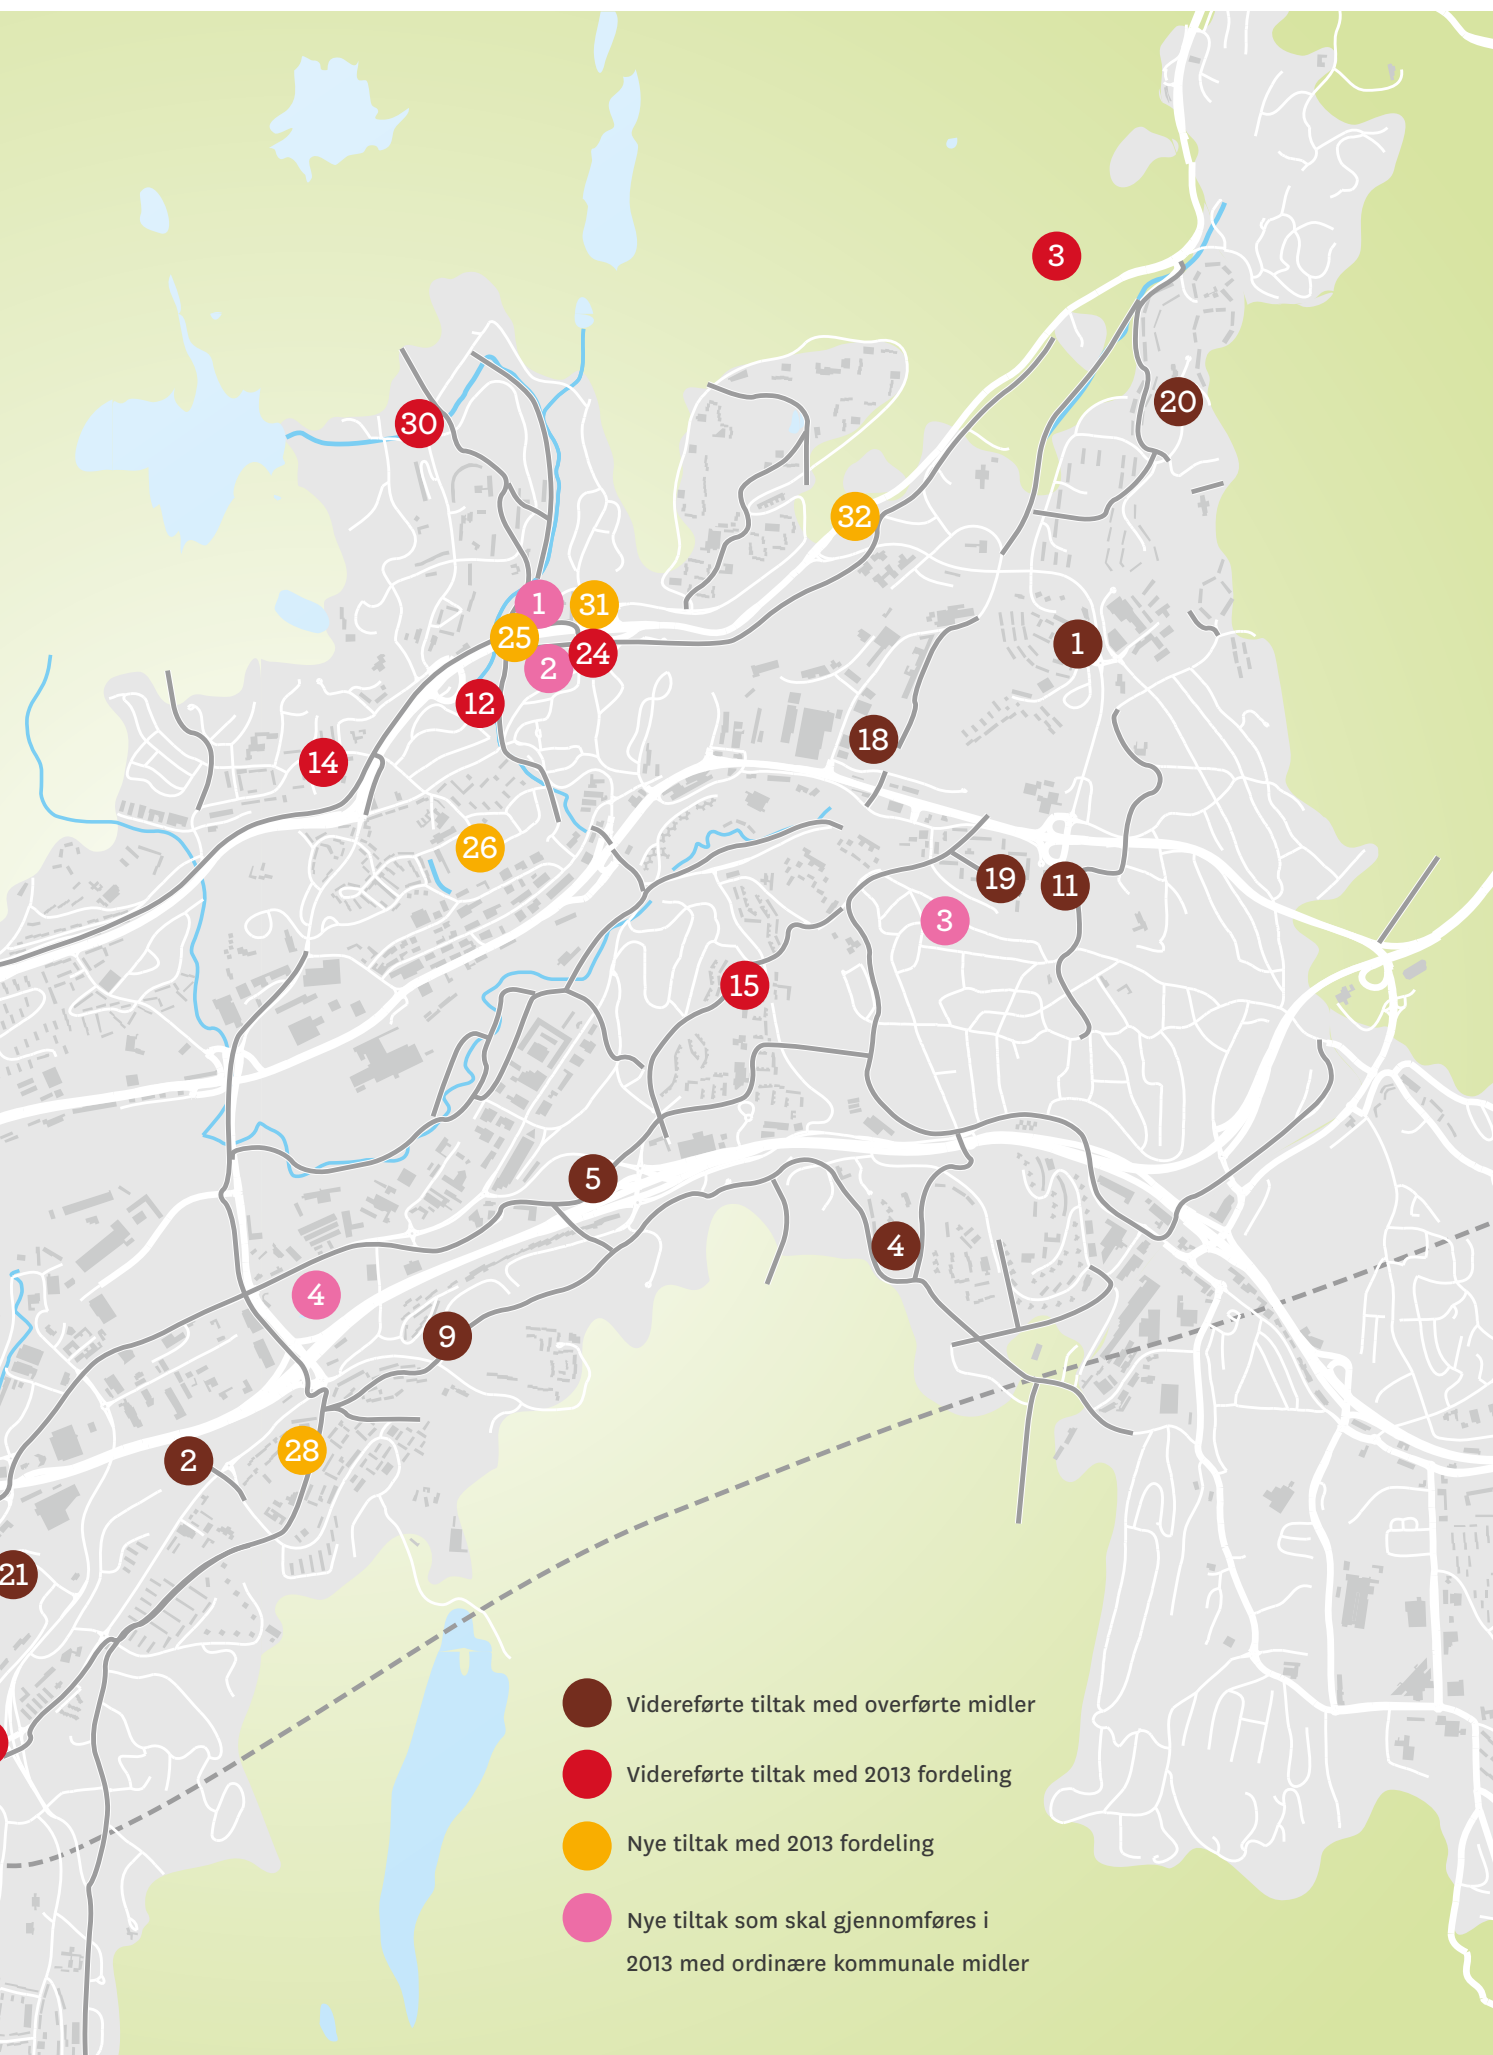

Mandat for Programgruppe 2

Innenfor samarbeidet mellom staten og Oslo kommune om å bedre miljøet i Groruddalen besluttet det Politiske møtet 9. januar 2006 å etablere et felles statlig - kommunalt program for Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø i Groruddalen. Utkast til et handlingsprogram skal forelegges Miljøverndepartementet og Byrådet. Programmet inngår i arbeidet med Miljøsonen Groruddalen.

Mandat for arbeidet med programmet

(Vedtatt av samarbeidsutvalget for Groruddalen, 7. april 2006)

Det er etablert et samarbeid mellom staten og Oslo. Hensikten er å utvikle et felles program for å gjenåpne Alna, bidra til sammenhengende grønnstruktur og turveier, tilrettelegge for idrett, samt aktivt vern og bruk av kulturminnene i Groruddalen. Programmet skal styrke dalens historieforståelse, identitet og stolthet. Det skal styrke dalens blågrønne preg og naturmangfold, gi bedre forhold for friluftsliv og idrett, fysisk aktivitet, gange og sykling og bidra til bedre lokalklima. Programmet skal fremme miljø og helse og supplere programmene for Miljøvennlig transport, Bolig-, by og stedsutvikling, samt Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. For disse programmene er henholdsvis Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet kontakter på statlig side.

Utkast til handlingsprogram skal utarbeides i et administrativt samarbeid mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, Friluftsetaten, Byantikvaren, Kultur- og idrettsetaten, Vann- og avløpsetaten, Plan- og bygningsetaten, fire bydeler i Groruddalen og Plankontoret for Groruddalen og staten ved Miljøverndepartementet,

Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Andre statlige og kommunale etater trekkes inn ved behov, som f.eks. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Tiltakene i programmet skal ordnes innenfor fire hovedtema:

Åpning av Alna

Prosjektet vil bli landets største elverestaurering og vil gå over mange år. Oslo kommune åpnet den første parsellen ved Hølaløkka i 2004 og arbeidet fortsatte i 2005, blant annet med vannrensing. Videre etapper for åpning av Alna med sidevassdrag og Hovinbekken skal defineres. Åpning av elveløp kan inngå som ledd i byutvikling og omlegging av infrastruktur og vil dermed gi de aktuelle områdene større verdi. Samarbeid tilstrebes med samferdselsmyndigheter og næringsliv i forbindelse med prosjekter innen samferdsel og byutvikling som Terminalområdet og Fossum-diagonalen/Rommensletta, området ved Grorud stasjon og Alnabru/Breivoll.

Utvikling av grønnstrukturen

Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen legges til grunn for arbeidet med å sikre og utvikle grønnstrukturen og kulturlandskapet for 120 000 mennesker. Sammenhengende grønne drag på langs og på tvers av dalen vil dempe virkningen av de dominerende transportårene og lette tilgjengeligheten til idrettsanlegg, parker og badeplasser, til dalbunnen og Marka. Idrettsparker og friluftsanlegg kan gjerne knyttes til grønnstruktur og turveinett. En helhetlig grønnstruktur vil fremme naturlig vegetasjon og biologisk mangfold, friluftsliv og helse og vil være et tilbud for skole og barnehager. Sammenhengende sykkel- og turveier etableres, blant annet langs Alnaelva mellom sentrum og Marka.

Vern og bruk av kulturminner og -miljøer

Kulturminneatlas for Groruddalen dokumenterer de rike kulturminnene med gårdsanlegg og kulturlandskap, samferdsel med oldtidsveier, steinbru og landets eldste jernbane, industrimin-ner og gruver, forsvarsanlegg og en viktig bolighis-torie. Kulturminnene ligger ofte i grønnstrukturen. Kulturminner skal vernes og brukes. Mange av disse kan utvikles som kulturbygg og knyttes sammen med turveier og grøntområder. Steder som Bånkall og Linderud gård, Tveten gård og Bakås Skanser, kan være gode mål for søndagsturen og bli viktige møte-steder. Vern og tilrettelegging for bruk av historiske kulturmiljøer og kulturlandskap vil synliggjøre kva-litetene, øke bevisstheten om dalens historie, opple-velsesverdi og identitet og vil styrke det sosiale livet.

Idrettsanlegg – tilrettelegging for fysisk aktivitet

Mange driver fysisk aktivitet i Groruddalen, både organisert og uorganisert idrett, men flere kan delta. Den organiserte aktiviteten foregår i regi av idretts-lag, foreninger og bedrifter, som benytter offentlige og private anlegg i sin virksomhet. Den egenorga-niserte aktiviteten krever at barn, unge og voksne har gode muligheter til å være fysisk aktive i stimu-lerende omgivelser, og enkel tilgang til balløkker og idrettsparker, badeanlegg, turveier, marka mv. I Groruddalen er det behov for blant annet flere kunst-gressbaner, badeanlegg, flerbrukshaller, klubbhus og nærmiljøanlegg. Behovene kan møtes både ved sam-let planlegging av idrettsanlegg og lokale strategier for fysisk aktivitet og tiltak.


Finansiering og tidsramme

Tiltak skal finansieres av partene i fellesskap, gjen-nom øremerkede midler til programområdet, Oslo kommunes årlige budsjetter og ved prioritering av statlige stimuleringsmidler til for eksempel friluft-

stiltak, miljøtiltak i vassdrag, kulturminner og uni-versell utforming. Videre kan spillemidler brukes til tiltak innenfor programmet, for eksempel turveier og idrettsparker. Arbeidet med programmet bygger på Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen og samord-nes med utarbeidelse av kommunedelplan for Alna. Det tilstrebes samarbeid og samfinansiering med sam-ferdselsmyndigheter og næringslivet. Groruddalens fire bydeler og frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere om lokale tiltak.

Tidsperspektiv for programmet settes i første omgang for perioden 2007-2009. Den helhetlige innsatsen fra stat og kommune og konkrete tiltak skal synliggjø-res. Rapport fra gjennomførte tiltak og et oppdatert plan- og tiltaksprogram forelegges Politisk møte hver år. Ansvaret for planlegging og gjennomføring tilleg-ges berørte etater og følges opp av en felles program-gruppe, ledet av Friluftsetaten.

Organisering av Groruddalssatsingen

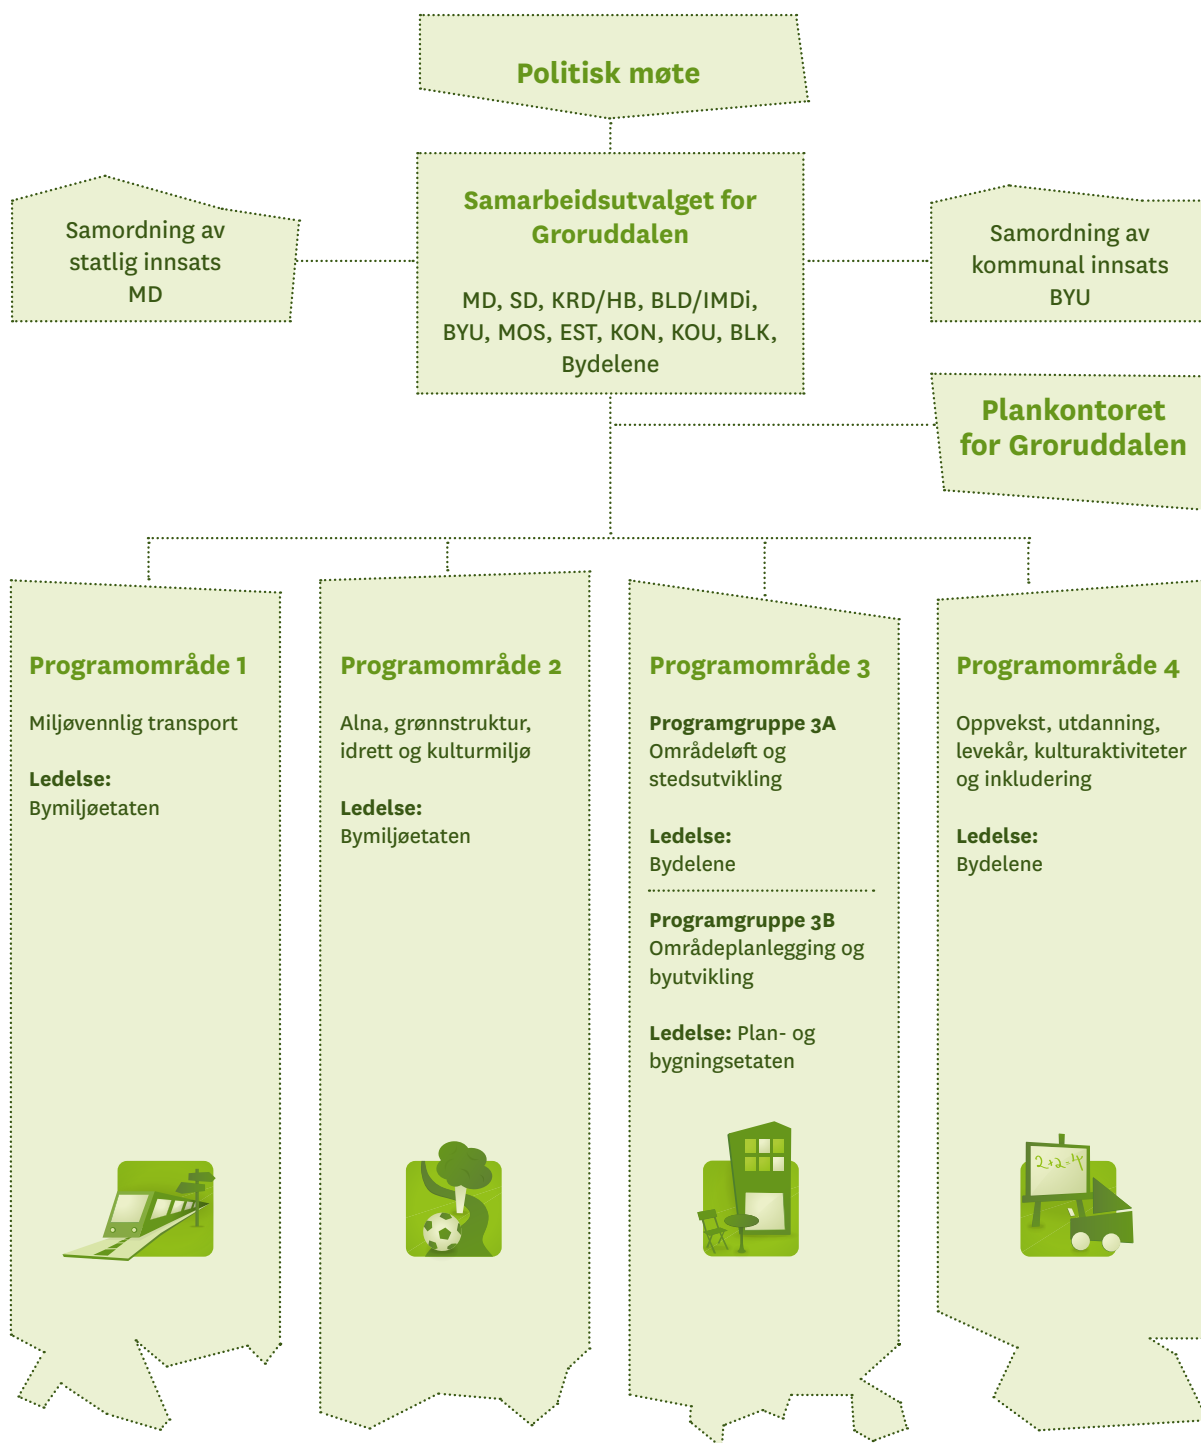



DEPARTEMENTENE



Oslo kommune

Intensjonsavtale mellom staten og Oslo kommune om Groruddalen

Intensjon og mål

Det er bred politisk enighet om at det trengs et felles løft for å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. Regjeringen og Oslo kommune ønsker en omforent innsats for å løse utfordringene. Regjeringen og byrådet har intensjoner om et langsiktig samarbeid om Groruddalen for 10-årsperioden 2007-2016.

Hovedmålet er en bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. Det utvikles et lokalt og inkluderende samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner. Groruddalens identitet og stolthet skal styrkes.

Bakgrunn

Oslo kommune opprettet i januar 2001 et eget kontor for Groruddalen. Et bredt planarbeid for Groruddalen startet. Bystyret vedtok 21. juni 2006 "Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Strategier for et bedre miljø mot 2030". Samarbeidet mellom staten og kommunen ble innledet i 2003 med Miljøsone Groruddalen. Soria Moria-erklæringen av 13. oktober 2005 sier at "Regjeringen vil gjennomføre tiltak for områder i storbyene som har særlige utfordringer, slik som Groruddalen i Oslo." Regjeringen og byrådet ble 9. januar 2006 enige om en felles satsing organisert i fire programområder.

Ansvar og organisering av samarbeidet

Oslo kommune har ansvaret for den helhetlige utviklingen i Groruddalen. Byrådsavdeling for byutvikling koordinerer arbeidet i kommunen og samarbeidet med staten. Miljøvern-departementet koordinerer statens innsats. Regjeringen vil styrke innsatsen i Groruddalen ut fra sitt ansvar for den nasjonale infrastrukturen, statlige eiendommer og virksomheter som er lokalisert der og ut fra et overordnet ansvar.

Regjeringen vil konsentrere den omforente innsatsen med Oslo kommune til fire programområder for å forbedre miljø og levekår (ansvarlig departement og byrådsavdeling angitt i parentes):

1. Miljøvennlig transport i Groruddalen (Samferdselsdepartementet og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel)
2. Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø (Miljøverndepartementet og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel)
3. Bolig-, by- og stedsutvikling (Kommunal- og regionaldepartementet og Byrådsavdeling for byutvikling)
4. Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering (Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester).

I program 4 deltar flere departementer og byrådsavdelinger, i tillegg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet i første rekke Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet. Byrådsavdeling for næring og kultur deltar i program 2 og 4. Byrådsavdeling for barn og utdanning deltar i program 4. Programmenes varighet kan være forskjellig. Lengden for program 3 "Bolig-, by- og stedsutvikling" er foreløpig satt til 2006-2010.

Samarbeidet mellom stat og kommune skal ledes gjennom årlige *Politiske møter* mellom miljøvernministeren og byrådslederen samt berørte statsråder og byråder. Det årlige Politiske møtet gir mål og retning for arbeidet, drøfter helheten og de økonomiske rammer for samarbeidet. Det administrativt sammensatte *Samarbeidsutvalget for Groruddalen* koordinerer samarbeidet og forbereder de politiske møtene. Utvalget skal ivareta helhet og spill mellom programmene, rapportere til Politisk møte, sørge for evaluering og formidling av erfaringer. Regjeringen og byrådet er enige om å legge stor vekt på å bygge ut det lokale samarbeidet med bydeler og offentlige institusjoner, beboere, organisasjoner, borettslag og næringslivet.

Programgrupper for de respektive programmene, med deltakere fra bydeler, kommunale og statlige etater og boligsamvirket (program 3), utarbeider egne handlingsprogram med konkrete tiltak, som godkjennes politisk. Programgruppene skal søke å utvikle samarbeid og samfinansiering med borettslag, næringslivet og lokale interesser om større tiltak. Det tilstrebes en områderett arbeidsform, der stedsutvikling, planlegging og gjennomføring av tiltak ses i sammenheng innenfor geografiske områder. Programgruppene skal rullere sine handlingsprogram årlig og rapportere til Samarbeidsutvalget og Politisk møte.

Finansiering

Stat og kommune har intensjoner om et styrket samarbeid i inntil 10 år og skal samfinansiere innsatsen. De økonomiske rammene avklares i de årlige budsjettprosessene i stat og kommune. De statlige og kommunale midlene fordeles til tiltak i de fire programmene i Groruddalssatsingen etter at de økonomiske rammene er avklart. Det stilles ikke krav om like store statlige og kommunale andeler i det enkelte programområde eller tiltak.


I 2007 har begge partene avsatt 50 mill. kroner som ekstramidler. De kommunale ekstramidlene fordeles til de fire programmene av byrådet. Statens ekstramidler består av 7 mill. kroner på Miljøverndepartementets budsjett og 43 mill. kroner på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. I tillegg er Groruddalen prioritert i de kommunale etatenes ordinære budsjetter og i de statlige Handlingsprogrammene 2006-2009 innenfor Nasjonal transportplan og i Handlingsplan for integrering og inkludering hvor om lag 20 mill. kroner skal brukes i Groruddalen.

Oslo, 11. januar 2007

På vegne av regjeringen


Helen Bjørnøy

På vegne av byrådet


Erling Lae
for

notater



Oslo Kommune

Byrådsavdeling for byutvikling

Plankontoret for Groruddalen

Rådhuset, 0037 Oslo

e-post: postmottak.pkg@radhuset.oslo.kommune.no

www.oslo.kommune.no/groruddalen

www.facebook.com/groruddalssatsingen

Design: Kord

Trykk: Print House (klimakompensert papir).



Groruddalssatsingen

